

# 舟山市治水治污大会战领导小组办公室文件

舟治水治污办发〔2019〕1号

## 关于2018年1至12月全市治水治污大会战重点任务及项目进展情况的通报

各县（区）、功能区管委会治水办（河长办）：

根据市级相关部门和各地报送情况，经审核，现将2018年1至12月全市治水治污大会战工作进展情况通报如下：

1至12月份，全市治水治污大会战总体进展平稳，成效显著，累计完成投资35.27亿元，完成率为106.04%。

### 一、水质情况

#### （一）总体情况

1~12月全市地表水功能区水质达标率为80.0%，同比下降15个百分点，I~III类水质比例为90.0%。其中白泉河、小高亭水库、长弄堂和基湖水库不达标，主要超标因子为总磷和氮氮；小高亭和基湖水库水质类别比上年同期下降。

省控及以上断面3个，分别为临城、虹桥水库、城关海滨桥，3个断面水质均变差，临城氨氮浓度上升44.9%，虹桥总磷浓度上升63.6%，城关海滨桥氨氮和总磷浓度分别上升7.7%、

11.5%。17个市控断面中有11个断面水质变差。

## （二）集中式饮用水源地

按Ⅲ类标准取水量加权平均评价，12月份我市县级以上饮用水源地水质达标率为100%。

## （三）交接断面

1~12月我市临城、磨心水库（由小高亭水库调整为磨心水库）、基湖水库3个交接断面水质达标率为66.7%，同比下降33.3个百分点。3个断面水质均变差，其中基湖水库未达到功能水质目标要求。

# 二、“品质河道”和“美丽河湖”建设

## （一）“品质河道”建设

各县（区）、功能区“品质河道”创建均已完成，经综合评定，定海区15条、普陀区5条、岱山县5条、嵊泗县1条、海洋产业集聚区1条、新城管委会3条、普-朱管委会4条（其中6个小微水体合并为1条）河道水体通过市级验收。

## （二）“美丽河湖”建设

全市计划建设“美丽河湖”7个，目前完成创建7条39公里市级美丽河湖，其中4条20公里河道申报省级美丽河湖，省水利厅进行了现场省级复评。

# 三、“污水零直排区”建设

**7个工业集聚区块创建：**定海工业园区完成55家企业排查并出具整改报告，修复53家。舟山国际粮油产业园区完成创建，并已完成区级验收。普陀浦西工业园区、展茅工业园区、沈家门生物园区完成创建。岱山县岱东工业园区和东沙工业园区已

完成创建工作并通过县级验收。

**4个城镇生活小区创建：**定海区锦鸿雅苑、新城管委会浙大安置小区一期、长峙岛翡翠苑二期小区和普陀区东港二期浙能蓝庭小区均完成排查及零星修复，并完成验收。

**8个乡镇（街道）试点建设：**定海区马岙街道、普陀区东极镇、白沙管委会、岱山县岱东镇、嵊泗县花鸟乡、普-朱管委会普陀山镇等6个乡镇（街道）已基本完成“污水零直排区”建设，并进行了验收和公示。定海区双桥街道已完成排查，开始进行整改，新城管委会临城街道正在开展排摸工作。

#### 四、水环境治理


##### （一）饮用水源保护

2018年全市计划实施14座水库和2条河道的综合治理。目前，定海虹桥水库（二期工程）、龙潭水库、龙王堂水库、东岙弄水库、岱山小高亭水库、岱南平地水库、嵊泗长弄堂水库等7座水库和盐仓河道综合治理已完工，完成年度计划投资的101.6%。展茅大使岙水库、龙潭水库、东岙弄水库、龙王堂水库等4座饮用水源水库一级保护区物理隔离均已完成建设。虹桥水库、小高亭水库完成水库安全保障达标建设，临城河水源正在开展同胜村、城隍头村的拆迁及环境整治。

##### （二）河湖库塘清淤

目前，全市累计完成河道综合治理27.42公里，完成年度任务的109.7%；累计河湖清淤方量120.466万方，完成年度任务100.4%；新增水域面积0.21平方公里，完成年度任务。

图 1 全市河湖库塘清淤完成率

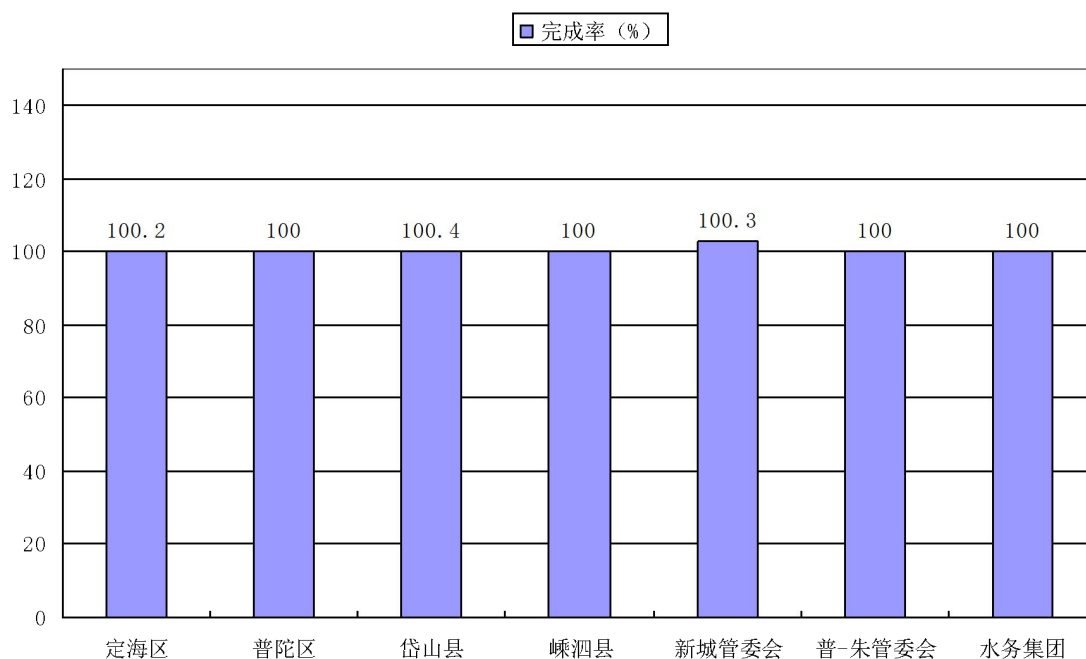

### (三) 防洪水、排涝水

#### 1、百项千亿防洪排涝工程

“百项千亿防洪排涝工程”计划完成投资 2.1 亿元，实施内容包括 10 座闸站建设、4 座水库扩容、3 条河道整治。目前已完成投资 2.3 亿元，完成年度投资计划的 110%。

#### 2、防洪工程

##### (1) 病险水库除险加固

全年计划实施病险水库除险加固 20 座，完工 8 座。目前，20 座水库除险加固工程全部开工，9 座已完工。

##### (2) 海塘提标改造

全年计划实施海塘提标改造 12 条，完成 2.26km。目前，12 条海塘已全部开工，其中 3 条已完工合计 2.48km。

##### (3) 水闸泵站改扩建

全年计划实施水闸泵站改扩建 15 座，完工 10 座。目前 15 座闸站全部开工，其中 10 座已完工。

### 3、排涝工程

全市计划综合整治城市河道 1 条，新城厂里河（约 900 米）清淤疏浚河道已完成。普陀展茅鱿鱼市场排涝泵站改造和开展易涝点治理已全部完成。

全市计划建设雨水管网年度任务 29 公里，12 月底已完成 31.378 公里，完成年度目标 108.2%；提标改造管网任务 5.4 公里，已完成 5.5 公里，完成年度目标 101.9%；雨污分流改造管网任务 5.4 公里，已完成 5.5 公里，完成年度目标 101.9%；清淤排水管网任务 465 公里，已全部完成。

**表 1 各地建设雨水管网项目完成情况表**

序号	县（区）功能区	计划建设雨水管网（公里）	实际完成	计划提标改造管网（公里）	实际完成	计划雨污分流改造管网（公里）	实际完成	计划清淤排水管网（公里）	实际完成
1	定海区	6	5.728	3	3	3	3	150	150
2	普陀区	6	6	1	1	1	1	150	150
3	岱山县	1	1	/	/	/	/	10	10
4	嵊泗县	1	1	/	/	/	/	5	5
5	海洋产业集聚区	5	5	/	/	/	/	/	/
6	新城管委会	5	5	/	/	/	/	150	150
7	普朱管委会	5	7.65	1.4	1.5	1.4	1.5	/	/
合计		29	31.378	5.4	5.5	5.4	5.5	465	465

#### 4、水利工程标准化管理

全市计划完成河道管理范围划界 130 公里。截至 12 底，定海区 51 公里、普陀区 45 公里、新城管委会 15 公里均已完成；岱山县 19 公里已完成方案编制及批复，完成图纸标绘。86 个水利工程标准化创建，目前已完成 147 项，超额完成任务。

#### (四) 保供水、抓节水

##### 1、大陆引水三期工程

大陆引水三期工程年度计划投资 5 亿元。截至 12 月底，水库大坝面板浇筑完成 80%，岱山段引水工程完成管道敷设 45 公里，超额完成任务，岱北加压泵站与马目泵站合并已完成招标并开工，但马目泵站因岱山缺水导致部分改造延期；今年累计完成投资 5.4 亿元。

##### 2、保供水

全年计划完成农村饮水安全提升工程人口 5.89 万人。目前，定海区农村饮水安全提升、普陀区桃花镇农村供水提升工程、岱山县衢山镇供水管网升级改造和嵊泗县库库联网改造 4 个工程、普陀区第九批小型农田水利项目县、岱山县中央财政水利发展资金小型农田水利项目均完成年度任务。东极镇东福山海水淡化工程正在调试；白沙岛海水淡化改造正处于设计阶段。

全市完成新建供水管网 16.63 公里，改造供水管网 62.5 公里，超额完成年度任务。

表 2 各地供水管网建设改造项目情况表

序号	责任单位	计划新建供水管网 (公里)	建成供水管网 (公里)	计划改造供水管网 (公里)	改造供水管网 (公里)
1	水务集团	10	12.63	5	5.5

2	定海	/	/	8	8
4	岱山	/	/	12	42.5
5	嵊泗	/	/	2	5
8	普朱管委会	2	4	3	1.5
合计		12	16.63	30	62.5

### 3、抓节水

全年计划建设屋顶集雨等雨水收集系统年度任务 175 处，改造节水器具任务 6600 套，改造水表 6000 只。截至 12 月底，累计完成 177 处雨水收集系统，改造节水器具 9500 套，改造水表 6000 户。

## 五、污染防治

### （一）地下水污染防治

全年计划完成 16 个加油站地下油罐更新改造。目前完成 17 座改造，超额完成年度任务，已完成所有加油站的 86%。

### （二）污水处理及配套设施建设

舟山市污水处理厂及配套（一期）工程根据规定继续开展采购结果确认前谈判和最终确认采购结果，场地临时基础设施进一步完善中；岛北污水处理厂完成总工程量的 90%；定海污水处理厂一二期（定海再生水厂）、朱家尖污水处理厂清洁排放技术改造正在开展前期准备，嵊泗县洋山镇城镇污水处理厂清洁排放技术改造完成前期立项工作；勾山污水处理厂 9000t/d 预处理设施主体工程施工完成，出水水质保持稳定达标排放；展茅污水处理厂 3000t/d 装配式应急污水处理设施目前正常运行中；干览污水处理厂 5000t/d 改扩建工程主体工程完工并投运；六横污泥处理设施已完工。

全市计划完成新增 50 公里城镇污水配套管网，修复改造污水管网 63.6 公里。12 月底，已完成新建污水管网 50.16 公里，完成年度目标 100.3%；已完成修复改造 70.805 公里，完成年度目标 111.3%。

**表 3 各地城镇污水管网建设修复项目情况表**

序号	责任单位	计划建设污水配套管网 (公里)	建成污水配套管网 (公里)	计划修复改造污水管网 (公里)	修复改造污水管网 (公里)
1	水务集团	6.6	7.5	/	/
2	定海	18.2	18.16	21.4	21.436
3	普陀	12.1	12.1	18.3	18.3
4	岱山	1.4	1.4	4.4	4.4
5	嵊泗	0.5	0.5	0.6	0.6
6	海洋产业集聚区	5	5	7.8	7.8
7	新城管委会	6.3	5.4	5	5
8	普朱管委会	/	/	6.1	13.269
合计		<b>50</b>	<b>50.16</b>	<b>63.6</b>	<b>70.805</b>

### (三) 固废、危废处置项目建设

定海岑港新建危险废物填埋场项目做好委托方案设计的工作；定海纳海工业固废扩建项目已投运；医疗废物处理中心已进入试运营；舟山垃圾焚烧发电三期工程主体工程基本完成；益民废物利用厂 3.2 万吨/年含油废物处置技改项目工程完工，并取得危险废物经营许可证，正在联机调试；浙江华业塑料机械有限公司原厂址污染地块累计处理废水 4980 余立方，年度土壤修复工程已完工并组织专家审核。

### (四) 工业大气污染防治

中海石油舟山石化公司烟气超低排放改造项目投入系统运



营。浙江华和热电有限公司舟山热电联产项目（一期）1#锅炉完成调试准备试运行，2#锅炉发电机组已完工准备调试。

### **（五）重点区块和重点行业、企业整治**

**1、定海区：**定海工业园区污水管网清淤检测累计完成 10 公里，修复破损管网 4 公里，今年计划新铺设 2.5 公里污水管网铺设，已全部完工。岑港烟墩工业区块污水管网、污水泵站、雨水管网、雨水泵站均已建设完成并通水。

舟山东方印染有限公司正在土建施工。浙江和泓环保纸业完成土建及设备全部完工，开始单机调式。本岛 3 家拟整合入园的电镀企业已取得土地，正在办理其他手续。金星螺杆电镀车间入园项目通过专家评审，正在报批。熔炼行业已制定方案开始整治。矿山行业整治基本完成（处于停产重组的豪舟建材除外）。

**2、普陀区：**观碛头区块、虾皮加工行业全面完成整治。浙江丰宇海洋生物制品有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、舟山市鼎汇食品有限公司等 3 家企业完成污水处理能力提升任务。鱿鱼市场提升改造累计完成投资 11205 万元。

**3、岱山县：**橡胶行业 7 家企业硫化废气治理全部完成整治，1 家企业处于停产状态。关闭 3 家小型船舶修理厂。着手进行岱美公司、银岱公司、天益鱼粉烟气脱硝治理，目前已完成安装。

**4、全市 4 家涉水特色行业企业整治：**浙江恒安水产食品有限公司、浙江富丹旅游食品有限公司、舟山惠生海洋工程有限公司、嵊泗县垃圾渗滤液及粪便污水处理工程均已按要求完成

整治。

## （六）农业农村污染治理

### 1、养殖污染治理

截至 12 月底，美丽牧场建设任务 2 个，已完成 3 个；500 头以上养殖场封闭式集粪棚改造任务 10 个，已完成 11 个，均超额完成任务。另外，定海区畜禽养殖场已关闭 15 家。

**表 4 500 头以上养殖场封闭式集粪棚改造统计表**

县（区）	任务数（个）	完成数（个）
定海区	6	7
普陀区	2	2
岱山县	1	1
嵊泗县	1	1
全市合计	10	11

### 2、农业面源污染

全市农业“两区”开展 6 个氮磷生态拦截沟渠示范点建设任务，建设任务基本完成，已组织对相关工作考核评价，其中 1 条通过考评，其余将在对存在问题完成整改及完善资料后复查。截至 12 月底，已减少不合理施用化肥 52.7 吨，完成年度任务 105.4%；农药减量 4.21 吨，完成年度任务 105.3%；推广商品有机肥 2.53 万吨，完成年度任务 110%。

### 3、农村环境综合整治

30 吨以上的农村生活污水处理设施标准化运维试点任务 12 个全部验收完成。

各地通过入户发放垃圾分类宣传册、配置垃圾桶等形式，

有序推进 88 个渔农村生活垃圾分类处理试点建设。定海区累计投资 850 万元，普陀区累计投资 1800 万元，岱山县累计投入资金 850 万元，嵊泗县累计投资 305 万元，新城管委会完成投资 55 万元。目前，渔农村生活垃圾分类处理试点建设任务已全部完成。

## **（七）近岸海域污染防治**

### **1、入海排污口清理整治**

全年计划完成 27 个入海排污口规范化整治提升，削减 7 个入海排污口。截至 12 月底，27 家入海排污口规范化整治提升已经全部完成验收。

### **2、近岸海域生态修复**

定海、普陀、岱山、嵊泗 4 个县级养殖水域滩涂规划均已编制完成并发布。全市计划建设水产养殖尾水生态化治理示范场（点）15 均已完成。全市计划增殖放流各类海洋水生生物苗种 49423 万单位，目前累计放流 130172.28 万单位。

全市计划配合饲料替代冰鲜鱼养殖推广面积 19000 亩、网箱 3400 只。普陀区完成 11000 亩，3000 个网箱；岱山县完成 8000 亩；嵊泗完成网箱 400 只。定海区完成 180 亩养殖塘尾水生态化治理；嵊泗完成养殖海域生态化改造 1000 亩，均完成年度任务。

## **六、河（湖）长制相关工作情况**

河（湖）长制工作深入推进，进一步完善河湖长体系，完成市级河长调整；完成舟山市 2018 年落实河长制工作总结并上报省委省政府；组织各级河长完成履职报告，上报总河长。

## 七、存在问题

从全市水质监测情况来看，部分监测断面水质呈下降趋势，需引起高度重视。5月、12月份，国家“水十条”考核断面临城河水质超标，12月份省控断面定海虹桥水库水质不达标，交接断面嵊泗县基湖水库水质全年不达标，市控断面定海区白泉河年平均水质不达标，其余定海区盐仓河、城关河、岑港河、大丰河、岱山县小高亭水库、嵊泗县长弄堂水库等均出现过不达标情况。

舟山市治水治污大会战领导小组办公室

2019年1月7日

办公室

---

抄送：市委、市人大常委会、市政府、市政协领导。

---

市委办、市府办、五大会战（大行动）办、市经信局、市生态环境局、市住建局、市水利局、市农业农村局、市综合行政执法局（市城管局）、市港航和口岸管理局、舟山海事局、市水务集团、市城投集团，各县（区）人民政府、功能区管委会，各县（区）经信局、环保局、住建局、水利局、农林局、城管局。

---

舟山市治水治污大会战领导小组办公室

2019年1月7日印发
