

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2022 年第 4 期，总第 49 期）

丽水市水利局办公室编

2022-5-12

2022 年 1-4 月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况


2022 年，全市计划完成水利建设投资 50 亿元，1-4 月完成投资 16.3 亿元，占年度计划的 32.7%，与时序要求相差 0.6 个百分点。


从完成率看，青田县、景宁县、缙云县、莲都区和遂昌县超过 40%，其中青田县完成率最高，已达到 54%；其余县（市）均未达到时序要求，其中松阳县完成率最低，仅 13.7%。从投资量看，缙云县和青田县完成投资量最大，均超过 3 亿元，分别占全市总投资量的 21.1%和 19.2%；松阳县、龙泉市、云和县和莲都区完成投资量低于 1 亿元，其中莲都区最低，仅 0.58 亿元。

丽水市 2022 年度水利建设投资进度表（1-4 月）

单位：亿元

县（市、区）	年度目标	完成情况	完成率
市本级	7.2	1.51	20.9%
莲都区	1.4	0.58	41.5%
龙泉市	3.2	0.81	25.2%
青田县	5.8	3.13	54.0%
云和县	3.4	0.71	21.0%
庆元县	6.6	1.98	30.0%
缙云县	8.3	3.45	41.6%
遂昌县	4.3	1.72	40.0%
松阳县	6.1	0.83	13.7%
景宁县	3.6	1.60	44.4%
合 计	50	16.32	32.7%

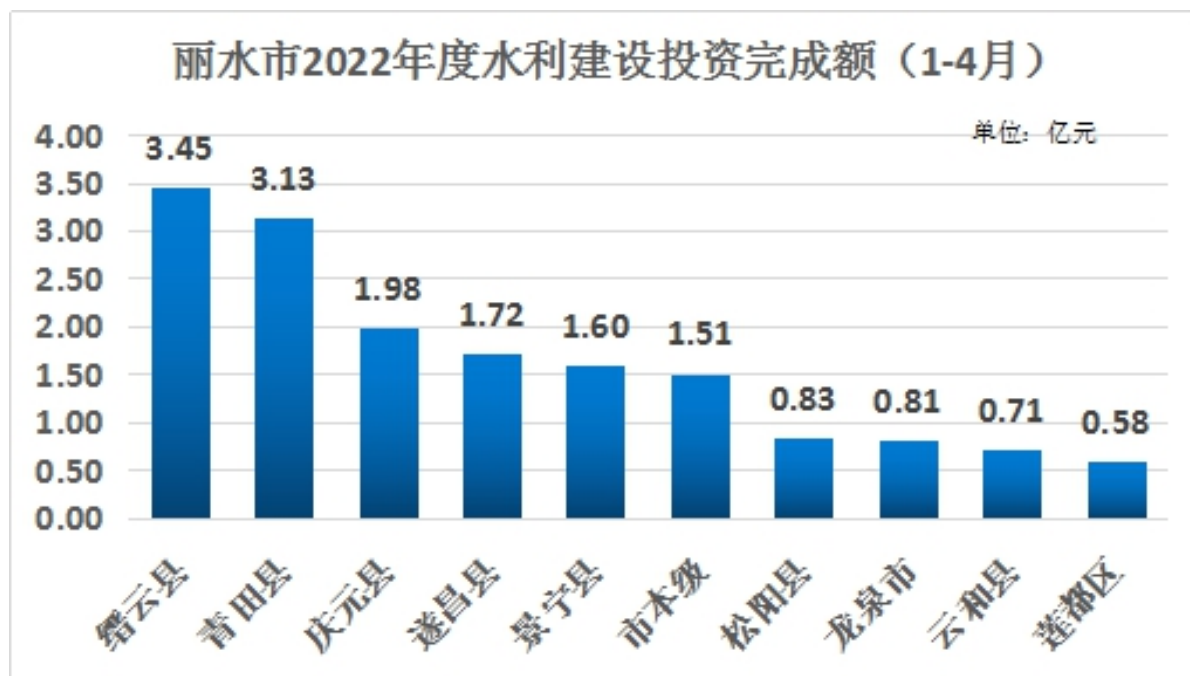

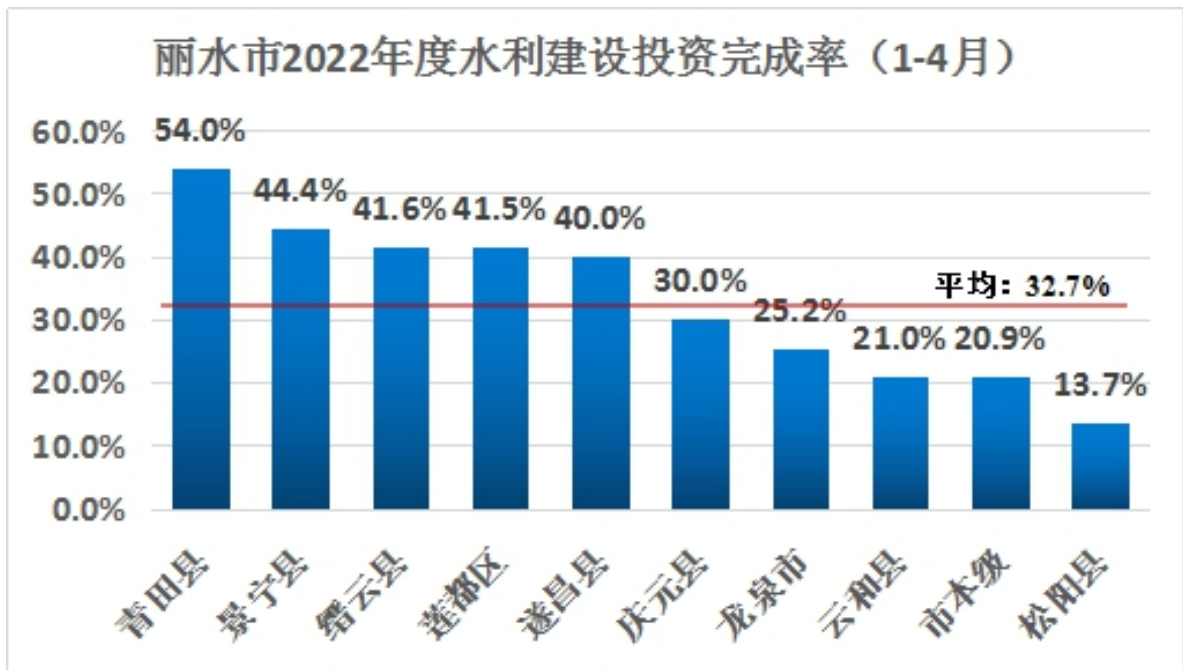

二、水利重大项目计划执行情况

2022年，全市计划投资30.3亿元，共开展22个重大水利建设项目，1-4月完成投资9.5亿元，占年度计划的31.3%，与时序相差2个百分点。各项目基本按原计划实施。

今年新开工6项，其中列入省级新开工的4项，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）和松阳县松古平原水系综合治理工程已于一季度开工建设，大溪治理提升改造工程二季度开工难度较大，青田县中部、西部引水工程预计三季度开工。此外，庆元县杨楼溪水库及供水工程和湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程力争年底开工。

丽水市 2022 年 1-4 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资	2022 年投资计划	完成投资额	完成率
合计			1815395	302995	94868	31.3%
1	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程	85302	30000	1055	3.5%
2		丽水市滩坑引水工程	70505	15000	5334	35.6%
3		丽水市城区排水防涝工程	36623	10000	7458	74.6%
4	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	13000	5000	500	10.0%
5	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	76713	5000	2168	43.4%
6		龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44243	7000	2690	38.4%
7	青田县	青田县小溪水利枢纽工程	145518	40000	13640	34.1%
8		青田县中部、西部引水工程	45000	2000	0	0.0%
9	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	75000	10000	39	0.4%
10		云和县龙泉溪治理二期工程	9324	4300	2400	55.8%
11	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	200666	40000	11000	27.5%
12		庆元县松源溪流域综合治理工程	60878	4000	2150	53.8%
13		庆元县杨楼溪水库及供水工程	51000	0	0	0.0%
14	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程	269292	50000	20520	41.0%
15		潜明水库引水工程	55181	15000	6094	40.6%
16	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	57426	1000	700	70.0%
17		湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程	57000	1000	0	0.0%
18	松阳县	松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流）	25054	1000	350	35.0%
19		松阳县松古平原水系综合治理工程	286600	35000	3800	10.9%
20	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	57629	2695	2000	74.2%
21		景宁县小溪流域综合治理工程（一期）	42441	6000	2970	49.5%
22		景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县	51000	19000	10000	52.6%

2022年，全市开展12个重大水利项目前期工作（其中5个为省重大前期），目前各项目进展较为顺利，但均无重大节点性成果。

丽水市2022年1-4月水利重大前期工作进度表

单位：万元

序号	工程名称	总投资	年度任务	目前进展
1	莲湖水库*	790000	完成可研编制	开展可行性研究专题的公开招标
2	紧水滩至滩坑水资源调配工程	500000	完成项建编制	开展项目调研和前期准备
3	莲都区碧湖平原水系综合治理二期工程	7500	完成可研编制，完成可研审查	可研编制
4	龙泉市均溪三级水库改建工程*	78000	完成可研审批	开展项建编制、地质勘探及测量工作
5	青田县新八源水库*	150000	完成项建受理，出具规模意见	完成规模论证初稿修改完善
6	棠溪水库*	174000	完善各专题、完成可研审查	公路专项方案设计完成编制；实物调查大纲完成审查
7	遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成可研审查	项目建议书已报省水利厅待审
8	松阳县团结水库	26000	开展初设编制、完成初设报批审批	完成项目建议书初稿
9	松阳县新处水库	100000	开展选址及规模论证专题研究评审	开展前期勘察设计（项目建议书）招标工作
10	浮云溪流域综合治理工程（崇头段、城区段）	6000	项目开工建设	完成方案设计，初步设计中
11	景宁县千峡湖库尾消落带生态修复及综合治理工程	250000	完成可研编制	完成可研编制报告
12	庆元县杨楼溪水库	50982	争取完成优化批准	进行方案优化


注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况


截止目前，全市共争取9812万元中央资金（不含山水项目中央专项资金），主要实施中小河流治理、中型灌区续建配套改造、水资源节约与保护、小型水库工程设施维修养护等

项目。截止4月底，21个项目共完成投资6956万元，其中完成中央投资4120万元，地方投资3677万元，完成率分别为42.0%和25.9%，龙泉市和市本级完成率为0。

2022年各县（市、区）争取中央资金情况

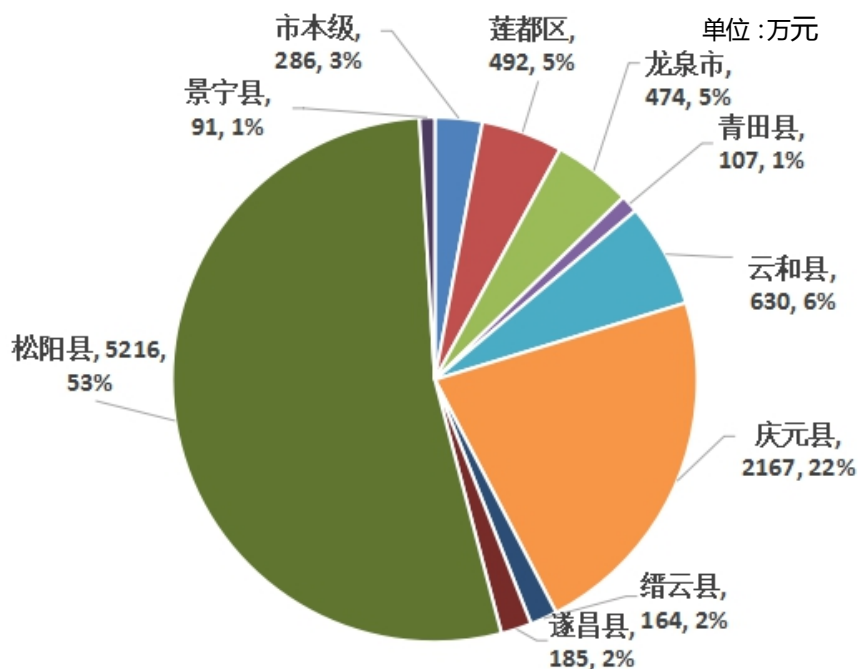

1-4月中央和总投资完成情况表

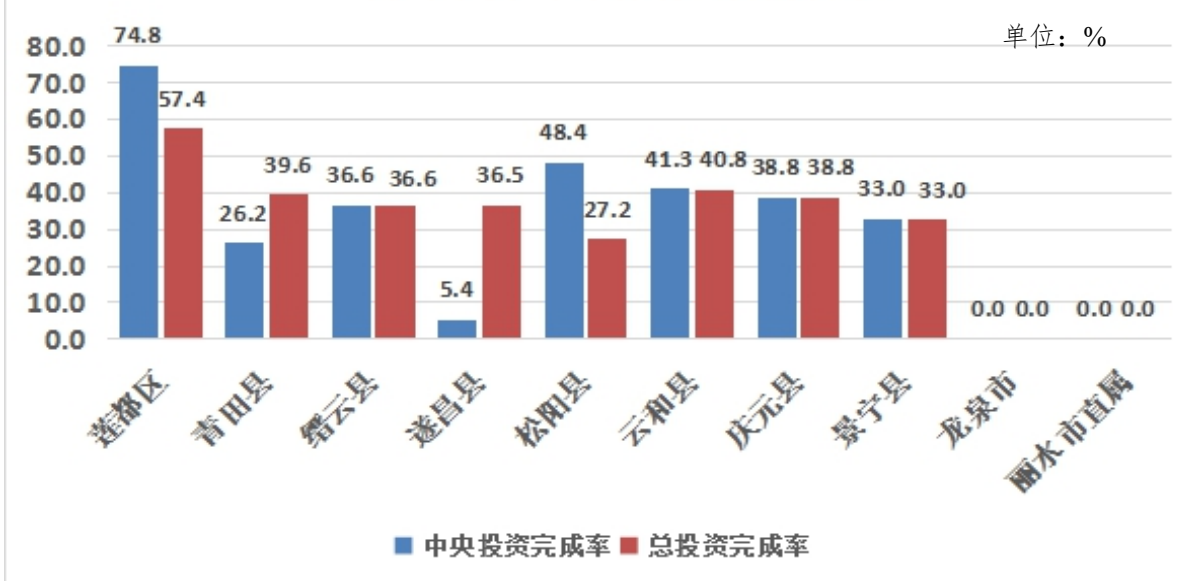

丽水市 2022 年 1-4 月中央投资项目计划完成情况表


单位：万元

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
	总 计	9812	24008	4120	7797	42.0%	32.5%
莲都区		492	989	368	568	74.8%	57.4%
	2022 年莲都区宣平流域综合治理工程	368	865	368	568	100.0%	65.7%
	莲都区 2022 年小型水库工程设施维修养护	124	124	0	0	0.0%	0.0%
青田县		107	139	28	55	26.2%	39.6%
	2022 年青田县小型水库工程设施维修养护	107	139	28	55	26.2%	39.6%
缙云县		164	164	60	60	36.6%	36.6%
	缙云县 2022 年小型水库工程设施维修养护	164	164	60	60	36.6%	36.6%
遂昌县		185	5637	10	2060	5.4%	36.5%
	遂昌县 2022 年中小流域综合治理项目	89	5500	0	2050	0.0%	37.3%
	遂昌县 2022 年小型水库工程设施维修养护工程	96	137	10	10	10.4%	7.3%
松阳县		5216	10370	2523	2823	48.4%	27.2%
	2022 年度松阳县松古平原水系综合治理	350	700	0	0	0.0%	0.0%
	2022 年度松阳县松阴溪界首至石门段综合治理工程	600	800	488	488	81.3%	61.0%
	2022 年度松阳县小港综合治理工程（二期）	2383	4583	800	1100	33.6%	24.0%
	2022 年度松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	1766	4150	1200	1200	68.0%	28.9%
	2022 年度松阳县小型水库维修养护工程	117	137	35	35	29.9%	25.5%

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
云和县		630	3330	260	1360	41.3%	40.8%
	2022年云和县安溪流域综合治理工程	139	1639	100	700	71.9%	42.7%
	2022年云和县云坛流域综合治理工程	400	1600	150	650	37.5%	40.6%
	2022年云和县小型水库工程设施维修养护	91	91	10	10	11.0%	11.0%
庆元县		2167	2167	841	841	38.8%	38.8%
	2022年庆元县松源流域综合治理工程	1887	1887	841	841	44.6%	44.6%
	2022年庆元县节水型社会	190	190	0	0	0.0%	0.0%
	2022年庆元县小型水库工程设施维修养护	90	90	0	0	0.0%	0.0%
景宁县		91	91	30	30	33.0%	33.0%
	景宁县2022年小型水库工程设施维修养护项目	91	91	30	30	33.0%	33.0%
龙泉市		474	474	0	0	0.0%	0.0%
	2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目	379	379	0	0	0.0%	0.0%
	2022年龙泉市小型水库维修养护项目	95	95	0	0	0.0%	0.0%
丽水市直属		286	646.76	0	0	0.0%	0.0%
	丽水接官亭水情教育综合基地	286	646.76	0	0	0.0%	0.0%

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2022年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，总投资13.24亿元，其中中央资金6亿元。

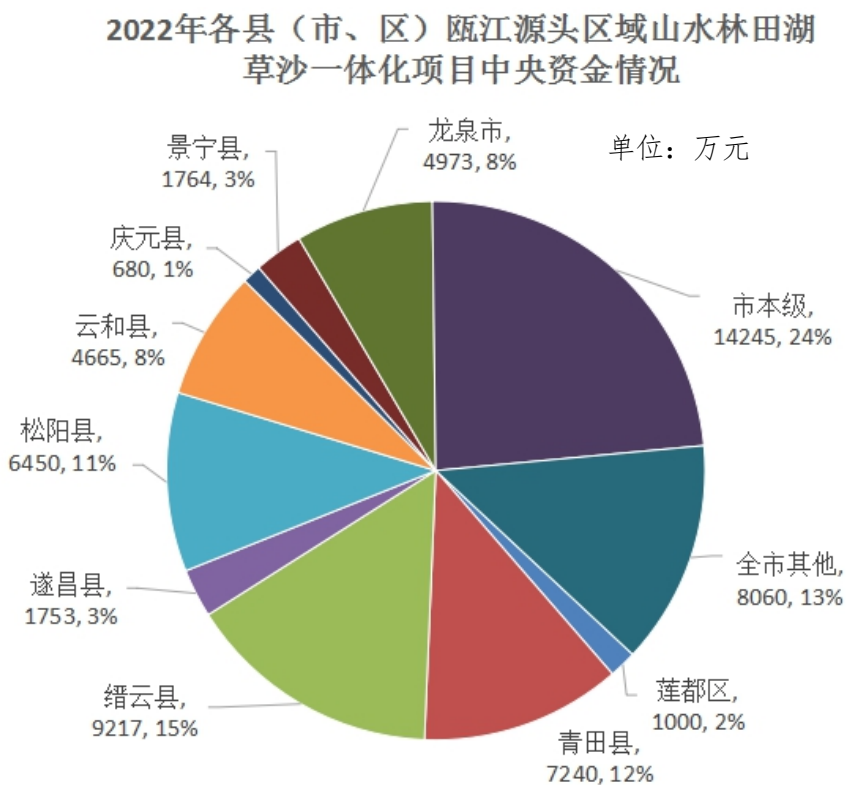

1-4月，完成投资3.0亿元，其中完成中央资金0.4亿元，完成率分别为22.7%和7.3%。缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、松阳县松阴河流域水生态保护修复项目（一期）、四都流域农田生态修复和提升工程、龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程和丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造目前处于项目前期状态，需加快前期进度，尽快开工。

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2022年计划投资		1-4月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	132444	60047	30006.5	22.7%	4388	7.3%
莲都区		2000	1000	500	25.00%	100	10.0%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	2000	1000	500	25.00%	100	10.0%
青田县		13760	7240	3030	22.0%	480	6.6%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	4987	1800	20.00%	0	0.0%
	青田县水电生态化改造	1760	1053	250	14.00%	0	0.0%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	3000	1200	980	33.0%	480	40.0%
缙云县		22958	9217	6576.7	28.65%	800	8.7%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	160	150	0	0.00%	0	0.00%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4000	2165	381.7	9.5%	0	0.00%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	18798	6902	6195	32.96%	800	11.6%
遂昌县		3500	1753	850	11.4%	200	24.3%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	3500	1753	850	11.4%	200	24.3%
松阳县		13760	6450	0	0.00%	0	0.0%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	6060	3222	0	0.00%	0	0.0%
	四都流域农田生态修复和提升工程	7700	3228	0	0.0%	0	0.0%
云和县		10017	4665	2439	24.35%	600	12.9%
	云和县龙泉溪治理二期工程	6017	4382	2400	39.89%	600	13.7%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	4000	283	39	0.98%	0	0.0%
庆元县		1200	680	50	4.10%	0	0.0%
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	1200	680	50	4.10%	0	0.0%
景宁县		4500	1764	2970	63.33%	500	28.3%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	4500	1764	2970	63.33%	500	28.3%

分类	工程名称	2022年计划投资		1-4月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
龙泉市		10126	4973	2728	26.94%	1708	34.4%
	龙泉市大贵河流域综合治理工程	2480	1435	965	38.9%	865	60.3%
	龙泉市道太河流域综合治理工程	1643	1206	643	38.20%	543	45.0%
	龙泉市安仁河流域综合治理工程	2535	1096	1000	39.45%	300	27.4%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	2760	990	120	4.30%	0	0.0%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	708	246	0	0.00%	0	0.0%
市本级		41623	14245	10563	25.37%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	16623	0	9508	57.2%	0	0.0%
	丽水市大溪治理提升改造工程	25000	14245	1055	2.00%	0	0.0%
其他县		9000	8060	300	3.3%	0	0.0%
	丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造	9000	8060	300	3.3%	0	0.0%

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：周映辰

丽水市水利局

2022年5月12日印发
