

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2022 年第 12 期，总第 57 期）

丽水市水利局办公室编

2022-12-6

2022 年 1-11 月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况

2022 年，全市计划完成水利建设投资 50 亿元，1-11 月完成投资 46.07 亿元，占年度计划的 92.1%，略高于时序进度。


从完成率看，青田县、莲都区、缙云县、松阳县均超额完成年度计划，其中青田县已超过年度计划约 33 个百分点，市本级完成率最低，仅 66.5%。从投资量看，缙云县和青田县完成投资量最大，超出全年目标 0.54 亿元和 1.89 亿元，分别为 8.84 亿元和 7.69 亿元，占全市总投资量的 19.2%和 16.7%；莲都区完成投资量最低，仅 1.57 亿元。

丽水市 2022 年度水利建设投资进度表（1-11 月）


单位：亿元

县（市、区）	年度目标	完成情况	完成率
市本级	7.2	4.79	66.5%
莲都区	1.4	1.57	112.1%
龙泉市	3.2	2.70	84.3%
青田县	5.8	7.69	132.6%
云和县	3.4	2.59	76.3%
庆元县	6.6	4.65	70.5%
缙云县	8.3	8.84	106.5%
遂昌县	4.3	4.20	97.6%
松阳县	6.1	6.21	101.8%
景宁县	3.6	2.83	78.6%
合计	50	46.07	92.1%

丽水市2022年度水利建设投资完成额（1-11月）

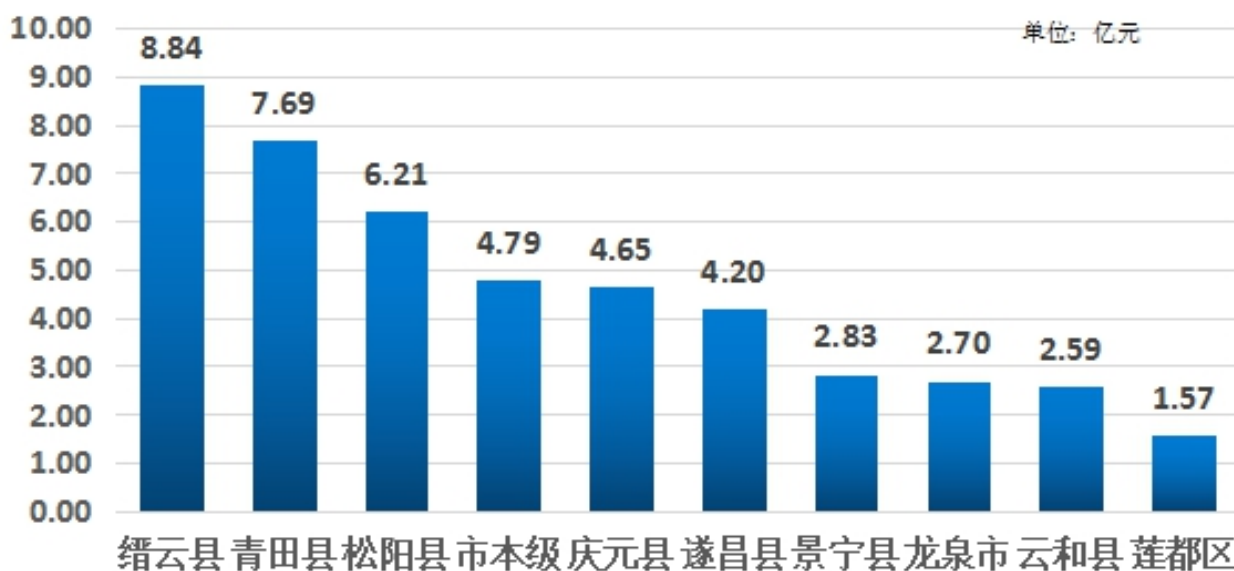

丽水市2022年度水利建设投资完成率（1-11月）

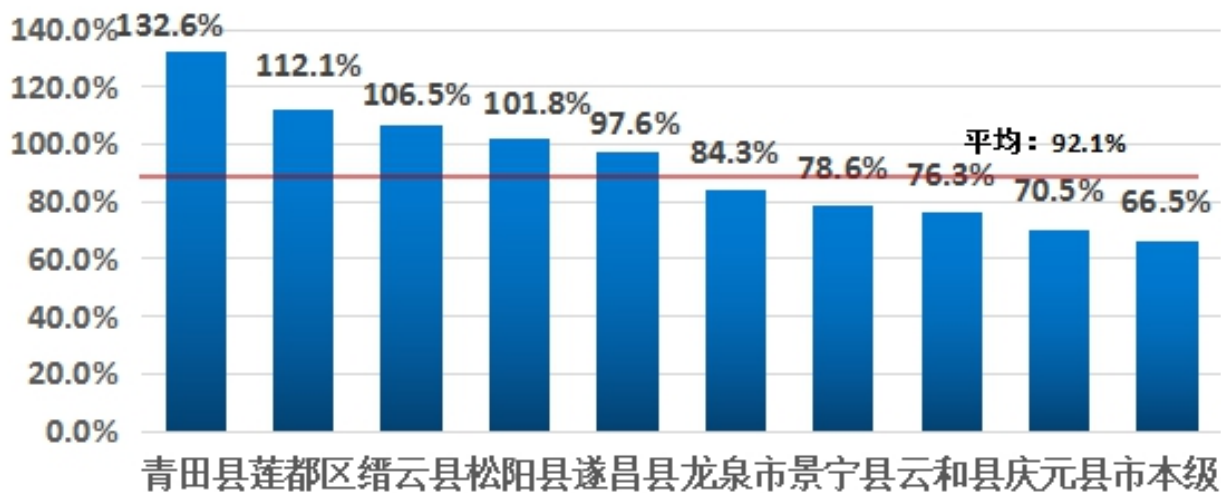

二、水利重大项目计划执行情况

2022年，全市计划投资30.3亿元，共开展20个重大水利建设项目，11月完成投资25.52亿元，占年度计划的84.32%，与时序相差约7个百分点，各项目基本按原计划实施。

今年新开工6项，其中列入省级新开工的4项，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）和松阳县松古平原水系综合治理工程已于一季度开工建设；青田县中部、西部引水工程于6月25日开工建设；大溪治理提升改造工程I标和II标开工建设，工程总承包III标完成合同签订，开展数字孪生应用模水利部中期评估；云和县浮云河流域综合治理工程仍处于招投标阶段，今年开工难度大；此外，庆元县杨楼溪水库及供水工程因庆元县城供水方案调整，杨楼溪水库不再作为庆元县城主要供水水源，项目暂缓。

丽水市 2022 年 1-11 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资	2022 年投资计划	完成投资额	完成率
合计			1733341	302600	255156	84.32%
1	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程	85302	30000	13000	43.33%
2		丽水市滩坑引水工程	70505	15000	14750	98.33%
3		丽水市城区排水防涝工程	36623	15000	15254	101.69%
4	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	13000	5000	4700	94.00%
5	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	76713	5000	9390	187.80%
6		龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44243	7000	6725	96.07%
7	青田县	青田县小溪水利枢纽工程	145518	40000	33910	84.78%
8		青田县中部、西部引水工程	45000	2000	2900	145.00%
9	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	75000	10000	1139	11.39%
10		云和县龙泉溪治理二期工程	9324	4300	4100	95.35%
11	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	200666	35000	15000	42.86%
12		庆元县松源溪流域综合治理工程	60878	4000	5008	125.20%
13		庆元县杨楼溪水库及供水工程	51000	1000	0	0.00%
14	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程	269292	50000	51920	103.84%
15		潜明水库引水工程	55181	15000	14333	95.55%
16	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	57426	1600	1600	100.00%
17	松阳县	松阳县松古平原水系综合治理工程	286600	35000	34200	97.71%
18	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	57629	2700	1890	70.00%
19		景宁县小溪流域综合治理工程（一期）	42441	6000	5670	94.50%
20		景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县	51000	19000	19667	103.51%

2022年，全市开展11个重大水利项目前期工作（其中6个为省重大前期）。11月，龙泉均溪三级水库和遂昌成屏二级水库等多个项目开展项目规模论证审查。其中，均溪三级水库改建工程和湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程完成年度任务难度大。

丽水市2022年1-11月水利重大前期工作进度表


单位：万元

序号	项目名称	总投资	年度任务	项目进度
1	莲湖水库*	790000	可研审查	省水利厅出具规模论证审查意见；实物调查大纲已通过省移民办组织的评审，省政府已下发停建通告，开展实物调查，完成可研咨询稿。
2	浙西南两库连通工程	500000	完成项建编制	编制项目建议书
3	莲都区碧湖平原水系综合治理二期工程	7500	完成可研编制，完成可研审查	完成可研初稿
4	龙泉市均溪三级水库改建工程*	78000	完成可研审批	完成规模论证审查会，修改后报批；完成文物调查，社会稳定风险评估，继续开展用地预审、地质灾害风险评估工作。
5	青田县新八源水库*	150000	完成项建受理，出具规模意见	完成规模论证报告修改。
6	棠溪水库*	174000	完善各专题、完成可研审查	完成工程规模论证；工程选址及用地预审审批中；完成水资源论证报告编制；完成上坝道路专项方案编制；完成可研报告咨询稿编制，处于技术咨询阶段。
7	遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	出具规模意见	项目建议书已受理，完成规模论证报告，可研编制中
8	松阳县团结水库	26000	开展初设编制、完成初设报批审批	建设项目用地预审与选址意见书办理中
9	松阳县新处水库	100000	开展选址及规模论证专题研究评审	可研报告编制中
10	湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程*	107000	完成可研审批，力争开工建设	可研报告省水利厅审核中
11	景宁县千峡湖库尾消落带生态修复及综合治理工程	250000	完成可研编制	编制项目建议书


注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金（不含山水项目中央专项资金）17020万元，主要实施中小河流治理、中型灌区续建配套改造、水资源节约与保护、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革等项目。

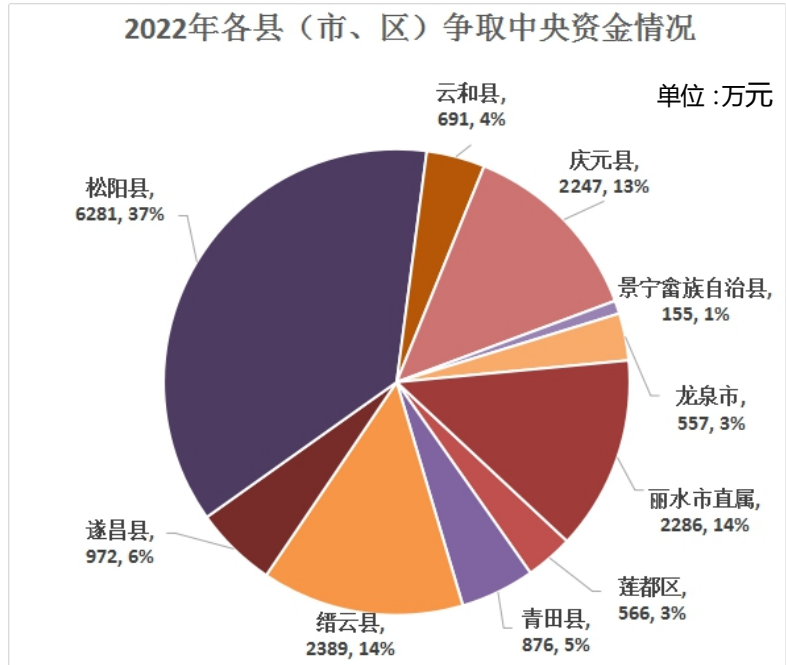

截止11月底，36个项目共完成投资39939.76万元，其中完成中央投资16219万元，地方投资23720.8万元，完成率均为95.3%和96.7%。青田县东坑水库水源工程的中央资金使用未达到时序要求，下一步要加快项目推进。

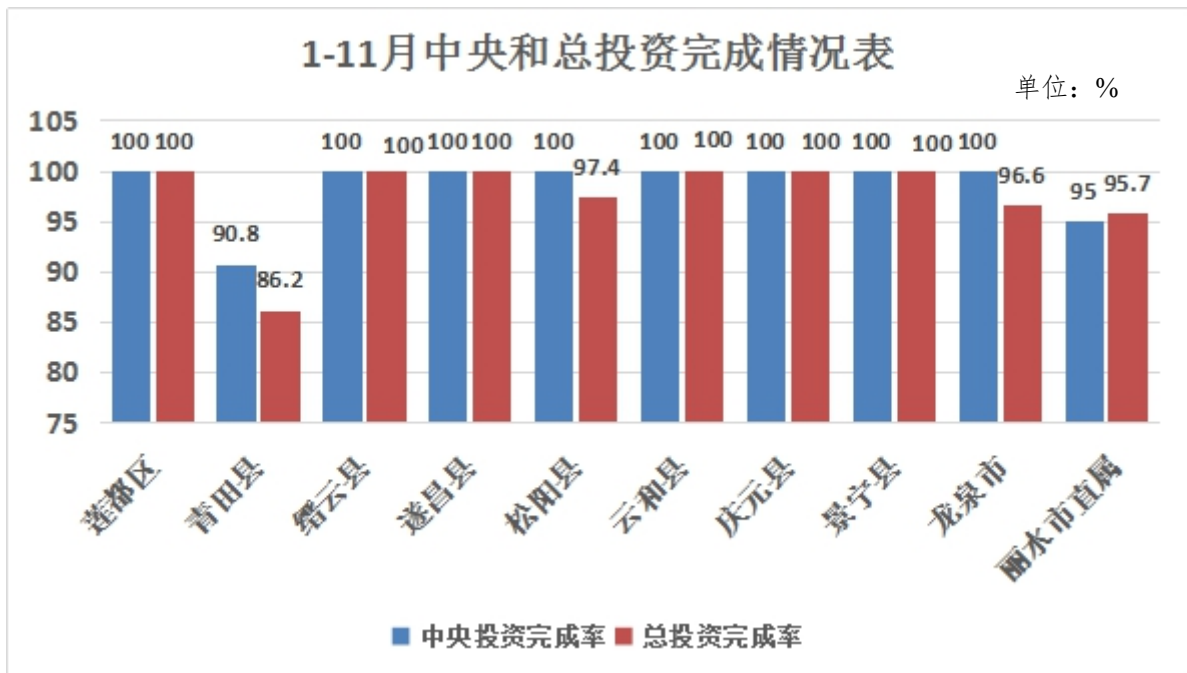

丽水市 2022 年 1-11 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
	总 计	17020.0	38190.56	16219	39939.8	95.3%	96.1%
莲都区		566.0	1063	566	1063	100.0%	100.0%
	2022 年莲都区宣平流域综合治理工程	368.0	865	368	865	100.0%	100.0%
	莲都区 2022 年小型水库工程设施维修养护	124.0	124	124	124	100.0%	100.0%
	2022 年莲都区农业水价综合改革	74.0	74	74	74	100.0%	100.0%
青田县		876.0	1505	795	1297	90.8%	86.2%
	青田县东坑水库水源工程	701.0	1128	620	920	88.4%	81.6%
	2022 年青田县小型水库工程设施维修养护	107.0	139	107	139	100.0%	100.0%
	青田县 2022 年农业水价综合改革	68.0	238	68	238	100.0%	100.0%
缙云县		2389.0	5889	2389	5889	100.0%	100.0%
	缙云县陈坑水库及配套水资源综合提升工程	2155.0	5655	2155	5655	100.0%	100.0%
	缙云县 2022 年小型水库工程设施维修养护	164.0	164	164	164	100.0%	100.0%
	农业水价综合改革	70.0	70	70	70	100.0%	100.0%
遂昌县		972.0	7495	972	7495	100.0%	100.0%
	遂昌县 2022 年中小流域综合治理项目	89.0	6000	89	6000	100.0%	100.0%
	遂昌县龙井坑水库工程	719.0	1000	719	1000	100.0%	100.0%
	遂昌县 2022 年小型水库工程设施维修养护工程	96.0	137	96	137	100.0%	100.0%
	遂昌县 2022 年农业水价综合改革项目	68.0	358	68	358	100.0%	100.0%
松阳县		6281.0	11435	6281	11135	100.0%	97.4%
	2022 年度松阳县松古平原水系综合治理	350.0	700	350	700	100.0%	100.0%
	2022 年度松阳县松阴溪界首至石门段综合治理工程	600.0	800	600	800	100.0%	100.0%
	2022 年度松阳县小港综合治理工程（二期）	2383.0	4583	2383	4583	100.0%	100.0%
	2022 年度松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	1766.0	4150	1766	3850	100.0%	92.8%
	2022 年度松阳县周坑水库	994.0	994	994	994	100.0%	100.0%
	2022 年度松阳县小型水库维修养护工程	117.0	137	117	137	100.0%	100.0%
	2022 年度松阳县农业水价综合改革项目	71.0	71	71	71	100.0%	100.0%


分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
云和县		691	3391	691	3391	100.0%	100.0%
	2022年云和县安溪流域综合治理工程	139	1639	139	1639	100.0%	100.0%
	2022年云和县云坛流域综合治理工程	400	1600	400	1600	100.0%	100.0%
	2022年云和县小型水库工程设施维修养护	91	91	91	91	100.0%	100.0%
	云和县2022年农业水价改革	61	61	61	61	100.0%	100.0%
庆元县		2547	2547	2547	5905	100.0%	100.0%
	2022年庆元县松源流域综合治理工程	1887	1887	1887	5150	100.0%	100.0%
	2022年庆元县节水型社会	190	190	190	285	100.0%	100.0%
	2022年庆元县小型水库工程设施维修养护	90	90	90	90	100.0%	100.0%
	庆元县2022年农业水价综合改革	80	80	80	80	100.0%	100.0%
	2022年庆元县智慧水网建设	300	300	300	300	100.0%	100.0%
景宁畲族自治县		155	155	155	155	100.0%	100.0%
	景宁县2022年小型水库工程设施维修养护项目	91	91	91	91	100.0%	100.0%
	景宁县2022年农业水价改革	64	64	64	64	100.0%	100.0%
龙泉市		557	2363.8	557	2283	100.0%	96.6%
	2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目	379	1673.3	379	1592.5	100.0%	95.2%
	2022年龙泉市小型水库维修养护项目	95	95	95	95	100.0%	100.0%
	2022年龙泉市农业水价综合改革项目	83	595.5	83	595.5	100.0%	100.0%
丽水市直属		1986	2346.76	1886	2246.76	95.0%	95.7%
	丽水接官亭水情教育综合基地	286	646.76	286	646.76	100.0%	100.0%
	2022年河长制湖长制管理	1700	1700	1600	1600	94.1%	94.1%

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2022年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，年度总投资13.24亿元，其中中央资金6亿元。

1-11月，完成投资10.44亿元：其中完成中央资金3.14亿元，完成地方资金

7.30亿元，完成率分别为52.3%和100.8%，总体进展较慢，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）、云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）、缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程、庆元县毛垟流域综合治理工程、景宁县小溪流域综合治理工程一期已完成今年中央投资目标。缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、云和县浮云溪流域综合治理工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程仍处于项目前期。

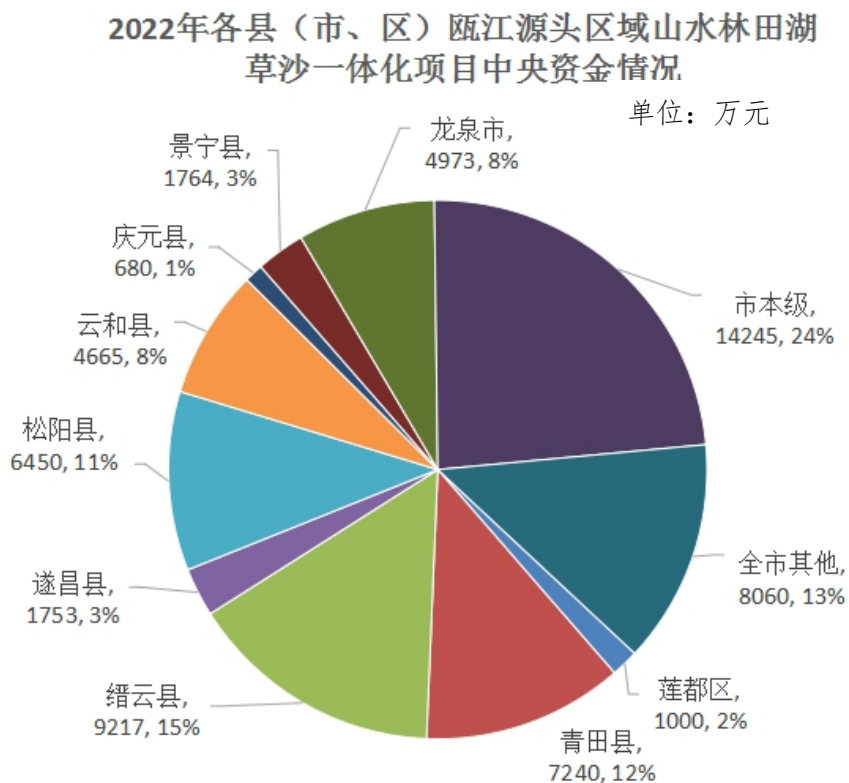

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2022年计划投资		1-11月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	132444	60047	104389	78.8%	31395	52.3%
莲都区		2000	1000	4700	235.0%	1000	100.0%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	2000	1000	4700	235.0%	1000	100.0%
青田县		13760	7240	12270	89.2%	6040	83.4%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	4987	8180	90.9%	4180	83.8%
	青田县水电生态化改造	1760	1053	1300	62.7%	660	66.0%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	3000	1200	2790	93.0%	1200	100.0%
缙云县		22958	9217	21092	91.9%	8052	87.4%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	160	150	190	118.8%	150	100.0%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4000	2165	2100	52.5%	1000	46.2%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	18798	6902	18802	100.0%	6902	100.0%
遂昌县		3500	1753	3150	90.0%	1600	91.3%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	3500	1753	3150	90.0%	1600	91.3%
松阳县		13760	6450	11700	85.0%	3371	52.3%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	6060	3222	5100	84.1%	2271	70.5%
	四都流域农田生态修复和提升工程	7700	3228	6600	85.7%	1100	9.3%
云和县		10017	4665	6800	67.9%	3200	68.6%
	云和县龙泉溪治理二期工程	6017	4382	4200	69.8%	3200	73.0%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	4000	283	2600	65.0%	0	0.0%
庆元县		1200	680	950	79.2%	750	110.3%
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	1200	680	950	79.2%	750	110.3%
景宁县		4500	1764	5670	126.0%	1764	100.0%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	4500	1764	5670	126.0%	1764	100.0%

分类	工程名称	2022年计划投资		1-11月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
龙泉市		10126	4973	6868	67.8%	3623	72.9%
	龙泉市大贵河流域综合治理工程	2480	1435	2400	96.7%	1405	97.9%
	龙泉市道太河流域综合治理工程	1643	1206	1588	96.7%	1138	94.4%
	龙泉市安仁河流域综合治理工程	2535	1096	2450	96.6%	1080	98.5%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	2760	990	400	14.4%	0	0.0%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	708	246	30	2.5%	0	0.0%
市本级		41623	14245	28254	67.9%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	16623	0	15254	91.8%	0	0.0%
	丽水市大溪治理提升改造工程	25000	14245	13000	52.0%	0	0.0%
其他县		9000	8060	2935	32.6%	1995	24.8%
	丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造	9000	8060	2935	32.6%	1995	24.8%

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：罗俊

编辑：周映辰

丽水市水利局

2022年12月6日印发
