

丽水市水利局简报

（水利建设投资）

（2022 年第 6 期，总第 51 期）

丽水市水利局办公室编

2022-7-4

2022 年 1-6 月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况


2022 年，全市计划完成水利建设投资 50 亿元，1-6 月完成投资 24.69 亿元，占年度计划的 49.4%，差时序要求 0.6 个百分点。


从完成率看，景宁县、莲都区、青田县、缙云县、遂昌县均达到时序要求，其中景宁县完成率最高，已达到 73.6%，云和县完成率最低，仅 29.7%。从投资量看，缙云县和青田县完成投资量最大，分别为 4.99 亿元和 3.81 亿元，占全市总投资量的 20.2% 和 15.4%；云和县和莲都区完成投资量较低，都在 1 亿元左右。

丽水市 2022 年度水利建设投资进度表（1-6 月）

单位：亿元

县（市、区）	年度目标	完成情况	完成率
市本级	7.2	2.42	33.6%
莲都区	1.4	0.95	68.1%
龙泉市	3.2	1.31	40.9%
青田县	5.8	3.81	65.7%
云和县	3.4	1.01	29.7%
庆元县	6.6	2.18	33.0%
缙云县	8.3	4.99	60.1%
遂昌县	4.3	2.58	59.9%
松阳县	6.1	2.80	45.8%
景宁县	3.6	2.65	73.6%
合 计	50	24.69	49.4%

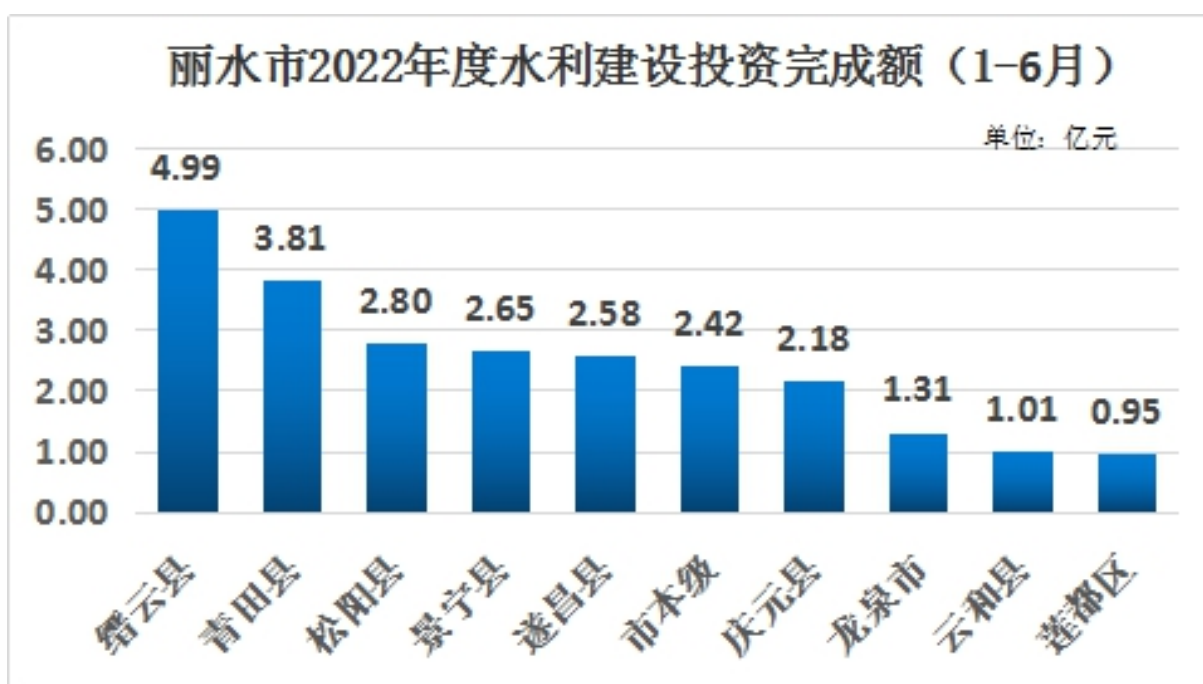

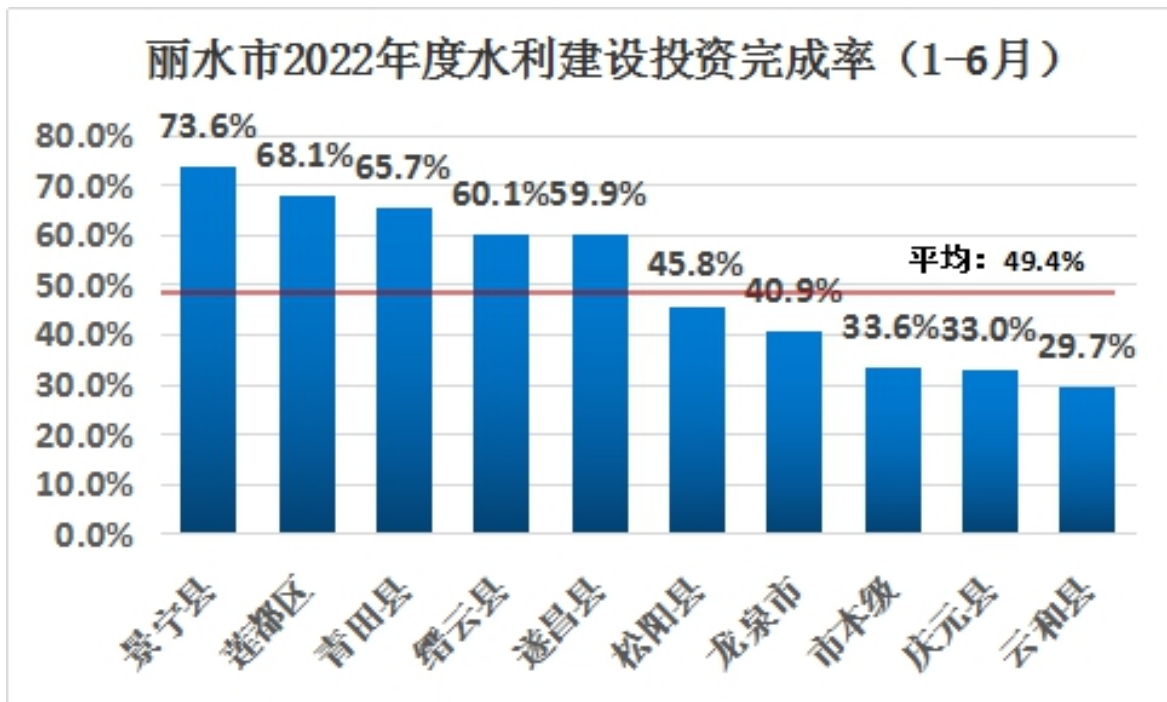

二、水利重大项目计划执行情况

2022年，全市计划投资30.3亿元，共开展22个重大水利建设项目，6月完成投资13.91亿元，占年度计划的45.9%，与时序相差约4.1个百分点，各项目基本按原计划实施。

今年新开工6项，其中列入省级新开工的4项，莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）和松阳县松古平原水系综合治理工程已于一季度开工建设；青田县中部、西部引水工程于6月25日开工建设；大溪治理提升改造工程预计三季度开工，年度完成3亿元投资量难度很大；云和县浮云河流域综合治理工程（崇头段、城区段）预计9月底开工，年度完成1亿元投资量难度很大。此外，庆元县杨楼溪水库及供水工程和湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程力争年底开工，但难度很大。

丽水市 2022 年 1-6 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资	2022 年投资计划	完成投资额	完成率
合计			1815395	302995	139126	45.92%
1		丽水市大溪治理提升改造工程	85302	30000	1910	6.37%
2	市本级	丽水市滩坑引水工程	70505	15000	7765	51.77%
3		丽水市城区排水防涝工程	36623	10000	12125	121.25%
4	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	13000	5000	2200	44.00%
5	龙泉市	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程	76713	5000	4033	80.66%
6		龙泉市竹垟一级水库及供水工程	44243	7000	4210	60.14%
7	青田县	青田县小溪水利枢纽工程	145518	40000	13640	34.10%
8		青田县中部、西部引水工程	45000	2000	400	20.00%
9	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	75000	10000	39	0.39%
10		云和县龙泉溪治理二期工程	9324	4300	2900	67.44%
11		庆元县兰溪桥水库扩建工程	200666	40000	7000	17.50%
12	庆元县	庆元县松源溪流域综合治理工程	60878	4000	2950	73.75%
13		庆元县杨楼溪水库及供水工程	51000	0	0	0.00%
14	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程	269292	50000	28220	56.44%
15		潜明水库引水工程	55181	15000	8442	56.28%
16	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	57426	1000	900	90.00%
17		湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程	57000	1000	0	0.00%
18	松阳县	松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流）	25054	1000	650	65.00%
19		松阳县松古平原水系综合治理工程	286600	35000	16300	46.57%
20	景宁县	景宁县金村水库及供水工程	57629	2695	1890	70.13%
21		景宁县小溪流域综合治理工程（一期）	42441	6000	3885	64.75%
22		景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县	51000	19000	19667	103.51%

2022年，全市开展12个重大水利项目前期工作（其中5个为省重大前期）。6月，莲湖水库规模论证通过省厅审查，此外，均溪三级水库改建、成屏二级水库扩容等多个项目也完成项目建议书批复。

丽水市 2022 年 1-6 月水利重大前期工作进度表


单位：万元

序号	工程名称	总投资	年度任务	目前进展
1	莲湖水库*	790000	完成可研编制	规模论证通过省厅审查
2	浙西南两库连通工程	500000	完成项建编制	完成省厅审查
3	莲都区碧湖平原水系综合治理二期工程	7500	完成可研编制，完成可研审查	可研编制
4	龙泉市均溪三级水库改建工程*	78000	完成可研审批	已完成项建批复，完成建设征地实物调查工作大纲（征求意见稿）编制，开展可研编制
5	青田县新八源水库*	150000	完成项建受理，出具规模意见	项目建议书报省发改委待受理
6	棠溪水库*	174000	完善各专题、完成可研审查	可研阶段编制方案
7	遂昌县成屏二级水库扩容工程*	200000	完成可研审查	完成项建批复，开展规模论证
8	松阳县团结水库	26000	开展初设编制、完成初设报批审批	完成可研报告技术审查
9	松阳县新处水库	100000	开展选址及规模论证专题研究评审	编制单位选择招标文件编制中
10	浮云溪流域综合治理工程（崇头段、城区段）	10000	项目开工建设	完成方案设计，初步设计初稿完成，正在优化中。
11	景宁县千峡湖库尾消落带生态修复及综合治理工程	250000	完成可研编制	开展项目建议书编制准备工作
12	庆元县杨楼溪水库	50982	争取完成优化批准	方案待定


注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金（不含山水项目中央专项资金）17020万元，主要实施中小河流治理、中型灌区续建配套改造、水资源节约与保护、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革等项目。

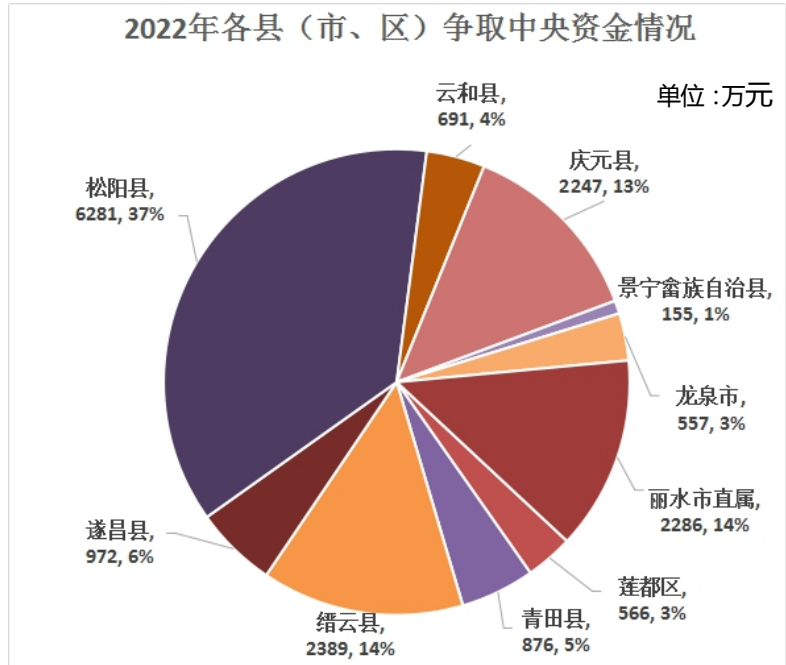

截止6月底，35个项目共完成投资18105万元，其中完成中央投资9419万元，地方投资8686万元，完成率分别为55.3%和49.2%。13个项目未达到实现要求，其中2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目、2022年龙泉市农业水价综合改革项目、云和县2022年农业水价改革、2022年河长制湖长制管理中央投资完成率为0。

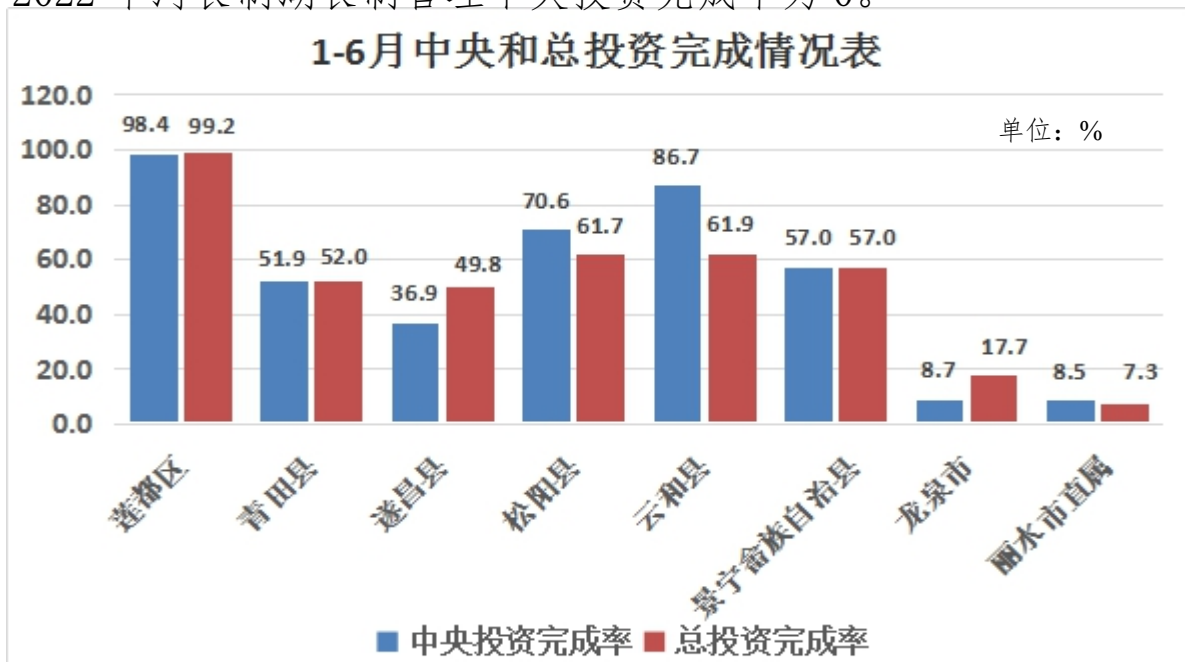

丽水市 2022 年 1-6 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元


分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
	总 计	17020	34691	9419	18105	55.3%	52.2%
莲都区		566	1063	557	1054	98.4%	99.2%
	2022 年莲都区宣平流域综合治理工程	368	865	368	865	100.0%	100.0%
	莲都区 2022 年小型水库工程设施维修养护	124	124	124	124	100.0%	100.0%
	2022 年莲都区农业水价综合改革	74	74	65	65	87.8%	87.8%
青田县		876	1505	455	782	51.9%	52.0%
	青田县东坑水库水源工程	701	1128	350	550	49.9%	48.8%
	2022 年青田县小型水库工程设施维修养护	107	139	55	82	51.4%	59.0%
	青田县 2022 年农业水价综合改革	68	238	50	150	73.5%	63.0%
缙云县		2389	2389	990	990	41.4%	41.4%
	缙云县陈坑水库及配套水资源综合提升工程	2155	2155	855	855	39.7%	39.7%
	缙云县 2022 年小型水库工程设施维修养护	164	164	100	100	61.0%	61.0%
	农业水价综合改革	70	70	35	35	50.0%	50.0%
遂昌县		972	7495	359	3729	36.9%	49.8%
	遂昌县 2022 年中小流域综合治理项目	89	6000	89	3209	100.0%	53.5%
	遂昌县龙井坑水库工程	719	1000	200	400	27.8%	40.0%
	遂昌县 2022 年小型水库工程设施维修养护工程	96	137	40	60	41.7%	43.8%
	遂昌县 2022 年农业水价综合改革项目	68	358	30	60	44.1%	16.8%
松阳县		6281	11435	4433	7055	70.6%	61.7%
	2022 年度松阳县松古平原水系综合治理	350	700	350	700	100.0%	100.0%
	2022 年度松阳县松阴溪界首至石门段综合治理工程	600	800	600	688	100.0%	86.0%
	2022 年度松阳县小港综合治理工程（二期）	2383	4583	1150	2800	48.3%	61.1%
	2022 年度松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	1766	4150	1766	2300	100.0%	55.4%
	2022 年度松阳县周坑水库	994	994	500	500	50.3%	50.3%
	2022 年度松阳县小型水库维修养护工程	117	137	58	58	49.6%	42.3%
	2022 年度松阳县农业水价综合改革项目	71	71	9	9	12.4%	12.4%

分类	项目名称	计划投资		完成投资		完成率	
		中央投资计划	总投资计划	已完成中央投资	总完成投资	中央投资完成率	总投资完成率
云和县		691	3391	599	2099	86.7%	61.9%
	2022年云和县安溪流域综合治理工程	139	1639	139	1139	100.0%	69.5%
	2022年云和县云坛河流域综合治理工程	400	1600	400	900	100.0%	56.3%
	2022年云和县小型水库工程设施维修养护	91	91	60	60	65.9%	65.9%
	2022年农业水价改革	61	61	0	0	0.0%	0.0%
庆元县		2247	2247	1695	1695	75.4%	75.4%
	2022年庆元县松源流域综合治理工程	1887	1887	1530	1530	81.1%	81.1%
	2022年庆元县节水型社会	190	190	80	80	42.1%	42.1%
	2022年庆元县小型水库工程设施维修养护	90	90	45	45	50.0%	50.0%
	2022年农业水价综合改革	80	80	40	40	50.0%	50.0%
景宁畲族自治县		155	155	88	88	57.0%	57.0%
	景宁县2022年小型水库工程设施维修养护项目	91	91	50	50	54.9%	54.9%
	景宁县2022年农业水价改革	64	64	38	38	60.0%	60.0%
龙泉市		557	2364	49	419	8.7%	17.7%
	2022年龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁小流域水土流失综合治理项目	379	1673	0	170	0.0%	10.2%
	2022年龙泉市小型水库维修养护项目	95	95	49	49	51.1%	51.1%
	2022年龙泉市农业水价综合改革项目	83	596	0	200	0.0%	33.6%
丽水市直属		2286	2647	194	194	8.5%	7.3%
	丽水接官亭水情教育综合基地	286	647	194	194	67.8%	30.0%
	2022年河长制湖长制管理	2000	2000	0	0	0.0%	0.0%

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2022年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，年度总投资13.24亿元，其中中央资金6亿元。

2022年各县（市、区）瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化项目中央资金情况

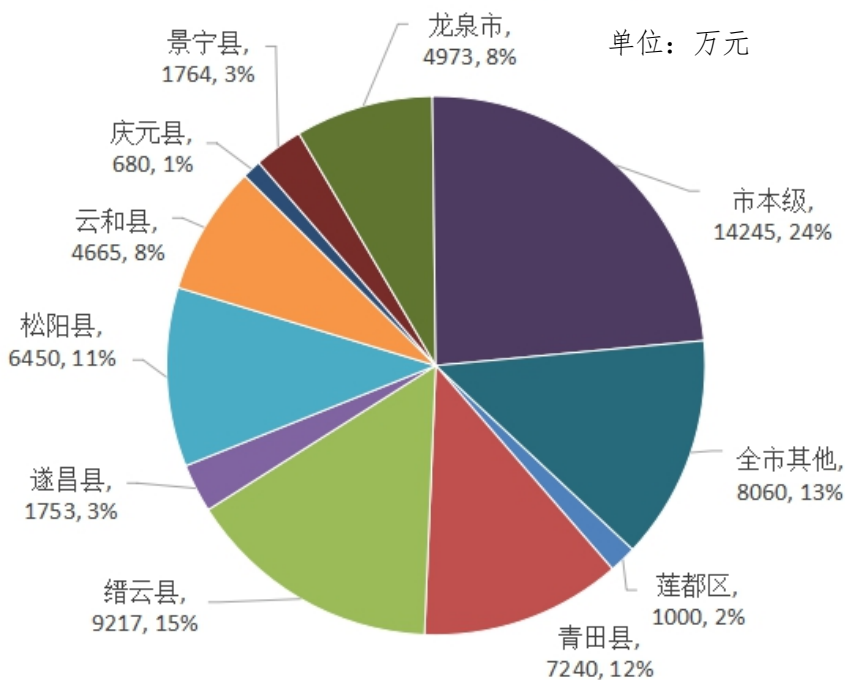

1-6月，完成投资5.12亿元，其中完成中央资金1.36亿元，完成率分别为38.6%和22.6%，总体进展较慢，除龙泉市大贵溪、道太溪和安仁河流域综合治理工程中央完成率达到时序要求外，其余项目均低于50%。龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、四都流域农田生态修复和提升工程、云和县浮云溪流域综合治理工程、庆元县毛垟溪流域综合治理工程、丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造，仍处于项目前期。

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2022年计划投资		1-6月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	132444	60047	51152	38.62%	13558	22.6%
莲都区		2000	1000	2200	110.0%	100	10%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	2000	1000	2200	110.0%	100	10%
青田县		13760	7240	5080	36.9%	2830	39.0%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	4987	3200	35.56%	2000	40.1%
	青田县水电生态化改造	1760	1053	500	28.4%	150	14.2%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	3000	1200	1380	46.0%	680	56.7%
缙云县		22958	9217	11340	49.39%	3835	41.6%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	160	150	20	12.5%	0	0.0%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4000	2165	820	20.5%	335	15.5%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	18798	6902	10500	55.9%	3500	50.7%
遂昌县		3500	1753	1500	42.9%	450	25.7%
	遂昌县松阴流域综合治理工程（一期）	3500	1753	1500	42.9%	450	25.7%
松阳县		13760	6450	4760	34.59%	1000	15.5%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	6060	3222	3050	50.3%	1000	31.0%
	四都流域农田生态修复和提升工程	7700	3228	1710	22.2%	0	0
云和县		10017	4665	3439	34.33%	1900	40.7%
	云和县龙泉溪治理二期工程	6017	4382	2900	48.20%	1900	43.4%
	云和县浮云溪流域综合治理工程	4000	283	539	13.48%	0	0.0%
庆元县		1200	680	200	16.67%	0	0.0%
	庆元县毛垟溪流域综合治理工程	1200	680	200	16.67%	0	0.0%
景宁县		4500	1764	3885	86.33%	1115	45.1%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	4500	1764	3885	86.33%	1115	45.1%

分类	工程名称	2022 年计划投资		1-6 月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
龙泉市		10126	4973	3923	38.74%	2328	46.8%
	龙泉市大贵河流域综合治理工程	2480	1435	1365	55.0%	1055	73.5%
	龙泉市道太河流域综合治理工程	1643	1206	903	54.90%	643	53.3%
	龙泉市安仁河流域综合治理工程	2535	1096	1395	55.03%	630	57.5%
	龙泉市八都河流域八都镇下游段综合治理工程	2760	990	260	9.42%	0	0.0%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	708	246	0	0.00%	0	0.0%
市本级		41623	14245	14325	34.42%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	16623	0	12415	74.7%	/	/
	丽水市大溪治理提升改造工程	25000	14245	1910	8.00%	0	0%
其他县		9000	8060	500	5.6%	0	0
	丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造	9000	8060	500	5.6%	0	0

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：汪小阳

编辑：周映辰

丽水市水利局

2022 年 7 月 4 日印发
