

丽水市水利局简报

(水利建设投资)

(2023年第4期, 总第61期)


丽水市水利局办公室编

2023-6-7

2023年1-5月全市水利计划执行情况

一、水利投资总体完成情况

2023年, 全市计划完成水利建设投资60亿元, 1-5月完成投资22.07亿元, 全省排名第五, 占年度计划的36.8%, 与时序进度相差4.9个百分点, 完成省厅任务52.5亿元的42.0%, 全省排名第三。

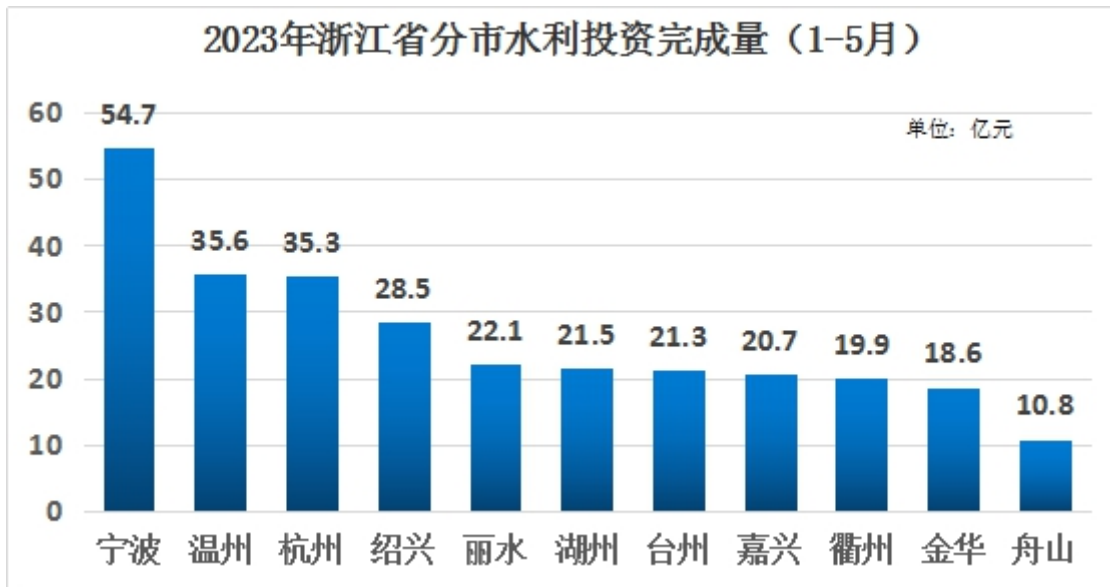



从完成率看，青田县、松阳县均超过 41.7%，达到时序进度，景宁县、龙泉市、市本级完成率较低。从投资量看，缙云县、青田县、松阳县完成投资量较大，分别为 3.90 亿元、3.69 亿元、3.59 亿元，占全市总投资量的 17.65%、16.72%、16.27%；低于 1 亿元的县有莲都区（0.85 亿元）、龙泉市（0.77 亿元）。

丽水市 2023 年度水利建设投资进度表

单位：亿元

县（市、区）	全年目标		1-5 月完成情况		
	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	完成率（60 亿）
市本级	8.2	8.3	1.83	22.4%	22.1%
莲都区	2.1	2.3	0.85	40.3%	36.8%
龙泉市	2.5	3.2	0.77	30.6%	23.9%
青田县	7.0	8.2	3.69	52.7%	45.0%
云和县	2.7	3.9	1.44	53.4%	37.0%
庆元县	6.0	7.0	2.62	43.7%	37.4%
缙云县	8.0	9.4	3.90	48.7%	41.4%
遂昌县	4.8	5.6	2.30	47.8%	41.0%
松阳县	8.2	8.5	3.59	43.7%	42.2%
景宁县	3.0	3.6	1.09	36.5%	30.4%
合计	52.5	60	22.07	42.0%	36.8%

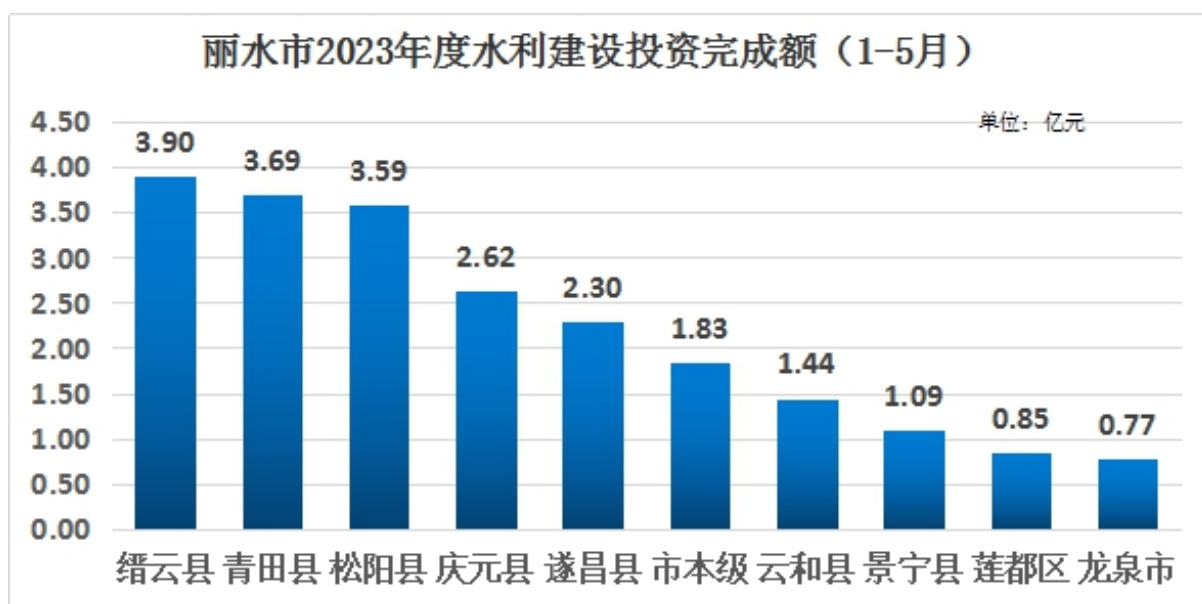

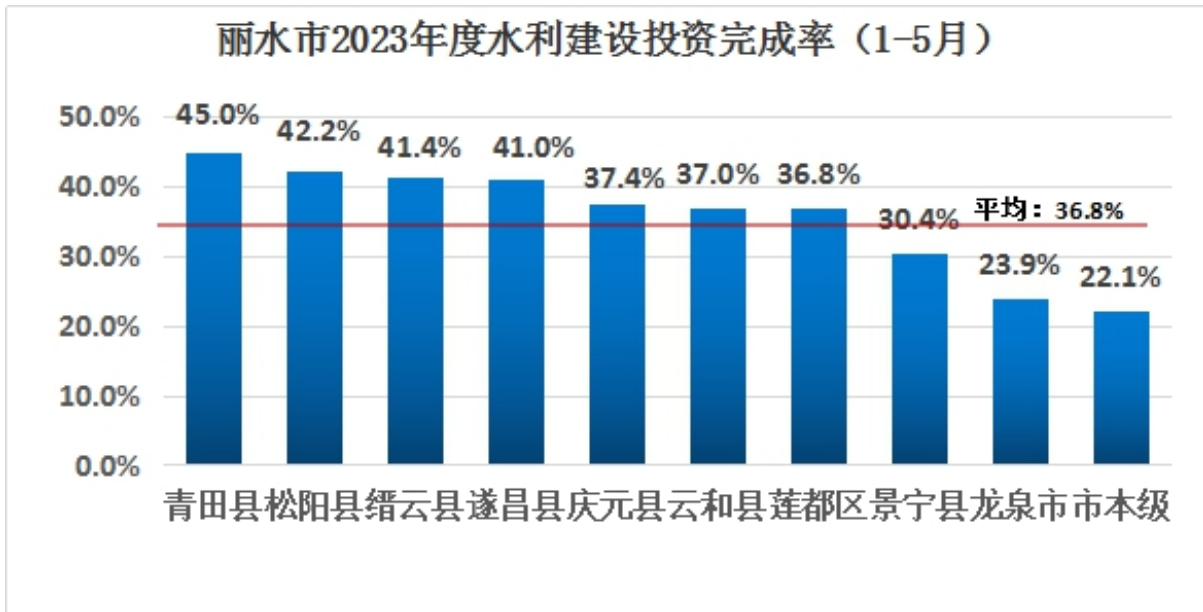

二、水利重大项目计划执行情况

2023年，全市计划投资35.4亿元，共开展32个重大水利建设项目，其中续建项目22个，新开工10个。

续建项目1-5月完成投资11.44亿元，占年度计划的40.6%，基本达到时序进度。滩坑引水工程、碧湖平原水系综合治理工程（一期）、中部、西部引水工程、兰溪桥水库扩建工程等12个项目进度符合预期；10个项目进度低于时序要求，其中，4个项目进度低于25%，分别是大溪治理提升改造工程（20.0%）、竹垵一级水库及供水工程（20.0%）、云和县龙泉溪治理二期工程（15.4%）、清水源水库引水工程（8.0%）。

新开工项目均计划于下半年开工，其中列入省级新开工的2项，莲湖水库工程和双港水库及供水工程计划今年年底前开工建设，其中莲湖水库工程年度完成5亿元难度大，已向省厅申请调整年度计划。龙泉市均溪三级水库改建工程和遂昌县成屏二级水库扩建工程前期工作相对滞后，今年开工难度大。

丽水市 2023 年 1-5 月水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

序号	区域	项目名称	总投资 (亿元)	2023 年投资计划			1-5 月完成情况		
				进展要求	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	计划完成率
合计			359	/	248824	353624	88741	35.7%	25.1%
续建			182	/	196824	281624	114409	58.1%	40.6%
1	市本级	滩坑引水工程*	7.1	完工见效	5000	7000	4081	81.6%	58.3%
2		城区排水防涝工程*	3.7	主体工程建设	500	500	500	100.0%	100.0%
3		大溪治理提升改造工程*	7.8	主体工程建设	15000	28000	5600	37.3%	20.0%
4		丽水市南明湖岸线改造工程	4.56	主体工程建设	/	4500	3000	/	66.7%
5		丽水南城防山洪排涝项目 (桐岭溪段)	8.38	完工见效	/	15000	4550	/	30.3%
6	莲都区	碧湖平原水系综合治理工程 (一期)*	1.5	完工见效	5000	5000	2500	50.0%	50.0%
7	龙泉市	梅溪、八都溪、岩樟溪流域 综合治理工程*	7.7	主体工程建设	1200	1200	895	74.6%	74.6%
8		竹垟一级水库及供水工程*	4.4	主体工程建设	5000	10000	2000	40.0%	20.0%
9	青田县	小溪水利枢纽工程*	14.6	主体工程建设	20000	20000	10091	50.5%	50.5%
10		中部、西部引水工程*	4.5	主体工程建设	10000	10000	5644	56.4%	56.4%
11	云和县	浮云溪流域综合治理工程*	7.5	完工见效	5000	5000	2000	40.0%	40.0%
12		云和县龙泉溪治理二期工程 *	0.9	开工建设	324	324	50	15.4%	15.4%
13		龙泉溪云和段综合治理工程	7	主体工程建设	/	1700	4000	/	235.3%
14	庆元县	兰溪桥水库扩建工程*	19.1	主体工程建设	20000	25000	11456	57.3%	45.8%
15		松源溪流域综合治理工程*	6.1	主体工程建设	8000	8000	2100	26.3%	26.3%
16	缙云县	潜明水库引水工程*	5.5	主体工程建设	5000	5000	2272	45.4%	45.4%
17		好溪流域综合治理工程*	26.9	主体工程建设	40000	50000	17400	43.5%	34.8%
18	遂昌县	清水源水库引水工程	2.65	主体工程建设	0	10000	800	/	8.0%
19		松阴溪流域综合治理工程 (一期、二期)	3.83	主体工程建设	0	8600	6100	/	70.9%
20	松阳县	松古平原水系综合治理工程 *	28.7	完工见效	50000	60000	24000	48.0%	40.0%
21	景宁县	金村水库及供水工程*	5.8	主体工程建设	800	800	335	41.9%	41.9%
22		小溪流域综合治理工程(一 期)*	4.2	主体工程建设	6000	6000	5035	83.9%	83.9%

序号	区域	项目名称	总投资 (亿元)	2023年投资计划			1-5月完成情况		
				进展要求	省级计划投资	计划投资	完成额	省级计划完成率	计划完成率
新建			176.31	/	52000	72000	0	0.0%	0.0%
1	市本级	莲湖水库工程*	72	完成可研审批,开工建设	50000	50000	0	0.0%	0.0%
2		城市内河整治提升工程(一期)	1.8	完成初设审批, I标开工建设	/	4000	0	/	0.0%
3		丽水南城防山洪排涝项目(丽景园段)	5.27	完成初设审批,开工建设	/	5000	0	/	0.0%
4	莲都区	碧湖平原水系综合治理工程(二期、三期)*	11.3	完成可研审批,开工建设	1000	2000	0	0.0%	0.0%
5	龙泉市	龙泉市均溪三级水库改建工程*	9	完成可研批复,开工建设	完成初设批复	/	0	/	/
6	青田县	新八源水库工程*	15	完成可研批复,开工建设	完成可研审批	/	0	/	/
7	缙云县	棠溪水库工程*	24.4	完成初设批复,开工建设	完成可研审批	5000	0	/	0.0%
8	遂昌县	遂昌县成屏二级水库扩建工程*	25.7	完成可研批复,开工建设	完成初设批复	/	0	/	/
9	松阳县	团结水库	2.1	完成初设批复,开工建设	/	1000	0	/	0.0%
10	景宁县	双港水库及供水工程*	10	完成可研审批,一期工程开工建设	1000	5000	0	0.0%	0.0%

注：*为列入省重大项目

2023年，全市开展8个重大水利项目前期工作，各项目进度基本符合计划要求。浙西南两库连通开展项建书在编；联城水系综合治理项目建议书完善，开展可研编制；城市内河整治提升工程（二期）开展初设在编；丽水南城防山洪排涝项目（核心区块）开展前期研究；雅溪水库综合利用提升工程开展可研编制；湖南镇水库综合保护与水生态修复工程（遂昌段）开展可研报审；新处水库开展项目建议书编制；滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合治理工程已完成项目赋码，完成项建书受理。


丽水市 2023 年水利重大前期工作进度表

序号	县（市、区）	工程名称	总投资（亿元）	2023 年计划		1-5 月完成情况
				省级任务	总体要求	项目进展
1	市本级	浙东引水-浙西南两库连通工程*	50.0	委托开展前期工作	完成项目立项	项建书在编
2	市本级	联城水系综合治理工程	10.0	/	完成初设批复力争开工	项目建议书完善，开展可研编制
3	市本级	城市内河整治提升工程（二期）	1.8	/	完成初设批复	初设在编
4	市本级	丽水南城防山洪排涝项目（核心区块）	4.0	/	完成初设批复	前期研究
5	莲都区	雅溪水库综合利用提升工程*	26.5	可研编制	可研编制	可研编制
6	遂昌县	湖南镇水库综合保护与水生态修复工程（遂昌段）*	4.9	完成可研审批	完成可研审批	可研报审
7	松阳县	新处水库	10	/	完成项目立项	项目建议书编制中
8	景宁县	滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合治理工程*	28.4	完成可研审查	完成可研审查	项目已赋码，项目建议书已受理

注：*为列入省重大前期项目

三、中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取中央资金（不含山水项目中央专项资金）21255万元，主要实施中小河流治理、中型灌区节水改造、小型水库工程实施维修养护、高风险区山洪灾害防御能力提升、小流域综合治理提质增效重点推进县建设等项目。

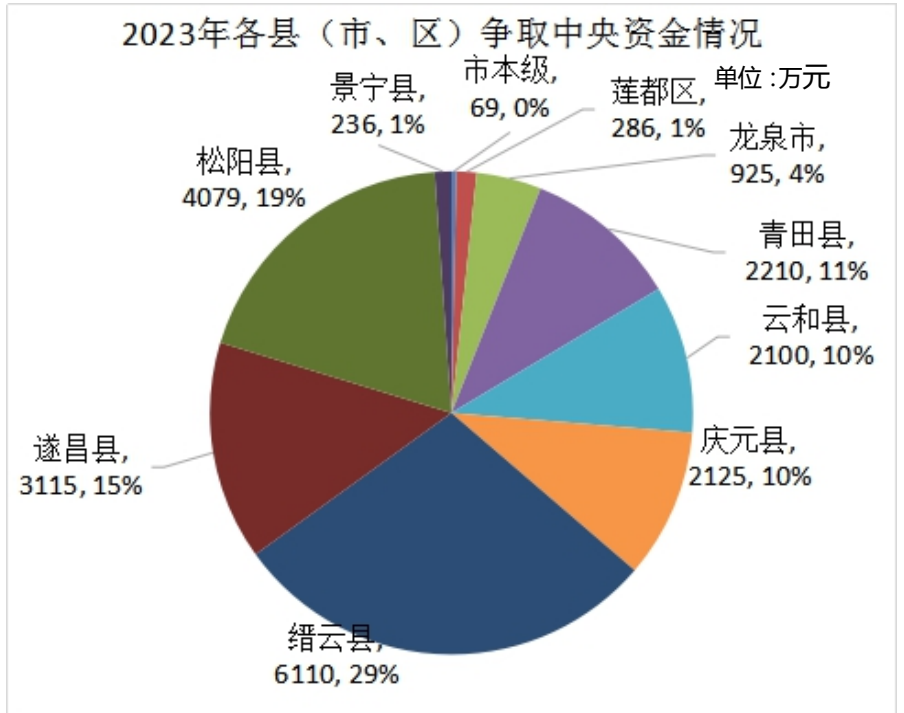

截止5月底，44个项目共完成投资17917万元，完成率为41.8%。松阳县、景宁县、遂昌县、缙云县的投资完成率达到时序进度，青田县官坑源小流域综合治理提质增效项目、2023年度松阳县山洪灾害防治项目、2023年丽水市本级高风险区山洪灾害防御能力提升工程等5个项目中央资金使用率为0，均为新增项目，下一步要加快项目推进。



丽水市 2023 年 1-5 月中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

分类	项目名称	中央投资计划	总投资计划	已完成投资	投资计划完成率
合计		21255.0	21571.9	17917.0	41.8%
莲都区		286.0	1394.0	660.0	39.3%
	2023 年莲都区农饮水工程维修养护	80.0	620.0	300.0	42.9%
	莲都区 2023 年小型水库工程设施维修养护	98.0	274.0	60.0	16.1%
	2023 年莲都区农业水价综合改革	108.0	500.0	300.0	49.3%
青田县		2210.0	3298.9	432.0	7.8%
	青田县阜山乡饮用水水源(芦苇湾水库)工程	522.0	1127.0	200.0	12.1%
	青田县 2023 年度农村供水站设施维修养护	77.0	23.0	72.0	72.0%
	青田县小型水库工程设施维修养护	81.0	31.9	70.0	62.0%
	青田县 2023 年农业水价综合改革	97.0	50.0	90.0	61.2%
	青田县官坑源小流域综合治理提质增效项目	1433.0	2067.0	0.0	0.0%
缙云县		6110.0	2990.0	4165.0	45.8%
	缙云县好溪支流方溪综合治理工程	350.0	100.0	250.0	55.6%
	缙云县盘溪和贞溪流域综合治理工程	1651.0	180.0	1030.0	56.3%
	缙云县好溪灌区续建配套和节水改造项目	1953.0	1591.0	520.0	14.7%
	缙云县羊母田水库及配套水资源综合提升工程	1831.0	990.0	2070.0	73.4%
	缙云县 2023 年农村农饮水工程维修养护	93.0	0.0	85.0	91.4%
	缙云县 2023 年小型水库工程设施维修养护	128.0	0.0	90.0	70.3%
	缙云县 2023 年农业水价综合改革	104.0	129.0	120.0	51.5%
遂昌县		3115.0	9128.0	6010.0	49.1%
	遂昌县 2023 年中小流域综合治理项目	2803.0	8615.0	5720.0	50.1%
	遂昌县 2023 年农村饮水工程维修养护项目	61.0	20.0	40.0	49.4%
	遂昌县 2023 年农业水价改革	101.0	325.0	200.0	46.9%

分类	项目名称	中央投资计划	总投资计划	已完成投资	投资计划完成率
	遂昌县 2023 年小型水库维修养护项目	74.0	31.0	50.0	47.6%
	遂昌县新溪源数字孪生小流域山洪灾害四御能力建设国家级重点试点项目	76.0	137.0	0.0	0.0%
松阳县		4079.0	1274.0	3723.0	69.5%
	2023 年度松阳县松古平原水系综合治理工程	3026.0	974.0	3000.0	75.0%
	2023 年度松阳县小港综合治理工程（二期）	700.0	300.0	600.0	60.0%
	2023 年度松阳县农饮水维修养护工程	78.0	0.0	32.0	41.0%
	2023 年度松阳县农业水价改革工程	104.0	0.0	46.0	44.2%
	2023 年度松阳县山洪灾害防治项目	82.0	0.0	0.0	0.0%
	2023 年度松阳县小型水库维养工程	89.0	0.0	45.0	50.6%
云和县		2100.0	3000.0	1625.0	31.9%
	2023 年云和县浮云溪流域综合治理工程（崇头段、城区段）	1866.0	3000.0	1500.0	30.8%
	2023 年云和县农村饮用水工程维修养护	75.0	0.0	40.0	53.3%
	2023 年云和县小型水库工程设施维修养护	70.0	0.0	35.0	50.0%
	2023 年云和县农业水价改革	89.0	0.0	50.0	56.2%
庆元县		2125.0	210.0	755.0	32.3%
	2023 年庆元县竹口溪流域综合治理工程	1344.0	50.0	550.0	39.5%
	2023 年庆元县安溪溪重点山洪沟防治治理工程	430.0	0.0	65.0	15.1%
	2023 年庆元县农饮水工程维修养护	79.0	0.0	50.0	63.3%
	2023 年庆元县小型水库工程设施维修养护	71.0	0.0	30.0	42.3%
	2023 年庆元县农业水价综合改革	119.0	0.0	60.0	50.4%
	庆元县高风险区山洪灾害防御能力提升	82.0	160.0	0.0	0.0%
景宁县		236.0	0.0	122.0	51.7%
	景宁县 2023 年农饮水工程维修养护项目	73.0	0.0	37.0	50.7%


分类	项目名称	中央投资计划	总投资计划	已完成投资	投资计划完成率
	景宁县 2023 年小型水库维养项目	70.0	0.0	36.0	51.4%
	景宁县 2023 年农业水价综合改革	93.0	0.0	49.0	52.7%
龙泉市		925.0	277.0	425.0	35.4%
	2023 年住龙镇水厂及水源建设工程 (潘床水库)	647.0	100.0	170.0	22.8%
	2023 年龙泉市小型水库维修养护工程	75.0	0.0	20.0	26.7%
	龙泉市农饮水工程维修养护	78.0	0.0	35.0	44.9%
	2023 年龙泉市农业水价综合改革项目	125.0	177.0	200.0	66.2%
丽水市 本级		69.0	0.0	0.0	0.0%
	2023 年丽水市本级高风险区山洪灾害防御能力提升工程	69.0	0.0	0.0	0.0%

四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划执行情况

2023年，瓯江源头山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）计划，共22个项目，年度总投资13.17亿元，其中中央资金7.33亿元。

1-5月，完成投资3.89亿元：其中完成中央资金1.63亿元，

完成地方资金2.26亿元，完成率分别为22.3%和38.8%，松阳县、景宁县、市本级总体进展较慢。青田县水电生态化改造、莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）、云和县龙泉溪治理二期工程等11个项目进度符合预期，3个项目进展滞后进度低于20%，分别是四都流域农田生态修复和提升工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程、松阳县松阴河流域水生态保护修复项目（一期）。

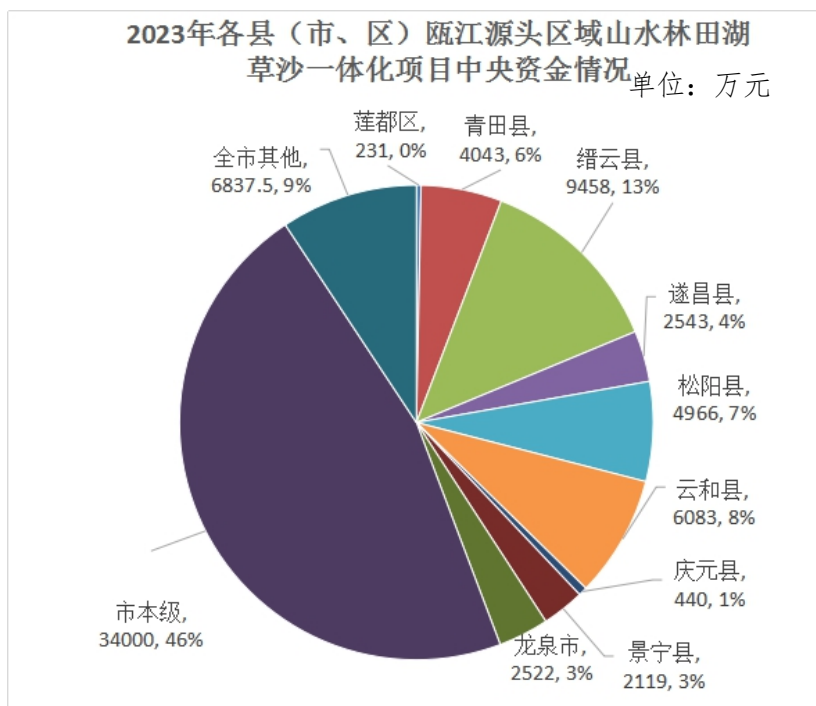

瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程（水利）

完成情况

单位：万元

分类	工程名称	2023年计划投资		1-5月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
	合 计	131668.5	73251	38942.6	29.57%	16304	22.3%
莲都区		3000	231	2500	83.33%	231	100%
	莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期）	3000	231	2500	83.33%	231	100%
青田县		10650	4043	4302	40.39%	1775	43.9%
	青田县环太鹤湖生态修复工程	9000	3471	2916	32.40%	1327	38.2%
	青田县水电生态化改造	1650	572	1386	90.00%	448	78.30%
	云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理工程（二期）	0	0	/	/	/	/
缙云县		23539.8	9458	5650	24.00%	3550	37.5%
	缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程	1410	1350	850	59.0%	850	63.0%
	潜明水库水源保护及生态修复工程	4231.6	1436	1000	23.0%	200	13.9%
	江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程	17898.3	6672	3800	21.0%	2500	37.5%
遂昌县		4450	2543	2000	44.94%	1040	56.43%
	遂昌县松阴河流域综合治理工程（一期）	4450	1843	2000	44.94%	1040	56.43%
松阳县		16277	4966	2720	16.70%	900	18.1%
	松阳县松阴流域水生态保护修复项目（一期）	4867	1506	620	12.74%	200	13.3%
	四都流域农田生态修复和提升工程	11410	3460	2100	18.4%	700	20.2%
云和县		9183	6800	5950	64.79%	3350	55.1%
	云和县龙泉溪治理二期工程	8233	6800	5550	67.41%	3350	49.3%
	云和县浮云河流域综合治理工程	950	0	400	42.11%	0	0.0%
庆元县		1600	440	930	58.00%	380	86.4%
	庆元县毛垟河流域综合治理工程	1600	440	930	58.00%	380	86.4%

分类	工程名称	2023年计划投资		1-5月完成投资			
		总投资	中央投资	完成投资	完成率	中央投资	完成率
景宁县		2119	2119	1200	60.00%	300	14.2%
	景宁县小溪流域综合治理工程一期	2119	2119	1200	60.00%	300	14.2%
龙泉市		8519	2522	2584	30.33%	1632	64.7%
	龙泉市大贵溪流域综合治理工程	1470	537	560	38.09%	400	74.49%
	龙泉市道太溪流域综合治理工程	944	109	400	42.37%	109	100.00%
	龙泉市安仁溪流域综合治理工程	1585	357	500	31.55%	200	56.00%
	龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程	4030	1240	795	13.75%	675	50.00%
	龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程	820	279	329	40.12%	248	88.9%
市本级		42513	34000	6713	15.79%	0	0.0%
	丽水市防灾减灾生态调水工程	1113	0	1113	100%	0	0.0%
	丽水市大溪治理提升改造工程	41400	34000	5600	20.00%	0	0%
其他县		9652.5	6837.5	4393.45	48.17%	3145.98	10.01%
	丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造	9652.5	6837.5	4393.45	48.17%	3145.98	10.01%

送：李汉勤副市长，叶龙标副秘书长，各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉

核稿：罗俊

编辑：周映辰

丽水市水利局

2023年6月7日印发
