设计单位
Design Institute

金华市城市规划设计院有限公司
JINHUA CITY
PLANNIGN & DESIGN Institute CO.,Ltd

设计修改联系单

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目	项目编号	2022-001
工程名称	小学部	联系单编号	JG-06
设计阶段	施工图	专　业	结构
主 送	金华市第四中学	抄　送	相关单位

更改原因 ☐ 外部审查要求 ☐建设单位要求 ☐ 监理建议 ☐ 施工建议 ☐设计原因

根据施工现场情况对危险较大的分部分项工程专项说明进行补充，具体如下：

混凝土模板支撑工程中搭设高度5m及以上的部位：

1. 1#、2#配电房5.3~6.9米.
2. 初中部门卫支模高度6.25米.
3. 初中部2~4层悬挑阳台：3-3、3-8轴交3-A、3-B轴，2-4、2-8交2-A、2-B轴
   小学部2~4层悬挑阳台：7-2、7-6轴交7-A轴，6-3、6-5轴交6-A轴，7-16、A-2轴交5-H轴，支模高度6.4米、7.8米.

混凝土模板支撑工程中搭设高度8m及以上的部位：

1. 风雨操场1、2轴交A、B轴支模高度8.4米.
2. 初中部2~4层悬挑阳台：3-3、3-8轴交3-A、3-B轴，2-4、2-8交2-A、2-B轴
   小学部2~4层悬挑阳台：7-2、7-6轴交7-A轴，6-3、6-5轴交6-A轴，7-16、A-2轴交5-H轴，支模高度14.2米.

盖章栏：

设　计		工程负责人		审　核		2022.08

金华市城市规划设计院有限公司

设计联系单

第 1 号

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目小学初中部	工程号	2022-001	专 业	建筑
建设单位	金华市第四中学	签 收		日 期	2024.04
设计更改原因	☐甲方变更 ☑设计变更 ☐施工图审查修改 ☐施工反馈修改 ☐其他				

联系内容：

金华四中小学初中部一层地面做法原设计3MM厚彩陶发光颗粒地面因实际效果较粗糙，不利清洁及摔倒易擦伤，现变更做法如下：

1、一层走廊地面做法同楼层走廊地面水磨石做法；（仅地下室顶板部分设1.5MM聚合物防水涂料）

2、架空层地面做法：

1）素土夯实

2）120厚碎石垫层，粗砂填缝压实

3）120厚C20混凝土垫层（有地下室部分1、2、3取消）

4）1.5厚聚合物水泥防水涂料 （仅地下室顶板部分设置）

5）C20细石砼找坡最薄处30厚干后卧铜条分隔（铜条间距1米*1米）（铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧每米4眼）

6）20厚1:2.5水泥彩色石子（8-12MM石子）地面，面掺8-12MM发光石，每平米1KG，表面固化磨光打蜡处理［防滑等级中(Cd)，静摩擦系数0.5≤COF＜0.6］；不同材料地面之间采用不锈钢板分隔。

以 下 空 白

设 计	校 对	项目(专业)负责人	审 核	审 定

本次共（1）页 第（1）页

注：该联系单一式五份 建设方，施工方各二份，设计存一份

金华市城市规划设计院有限公司

设计联系单

第 G02 号


项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目	工程号	2022-001	专　业	给排水
建设单位	金华市第四中学	签　收		日　期	2024.05
设计更改原因	☐ 甲方变更 ☑ 设计变更 ☐ 施工图审查修改 ☐ 施工反馈修改 ☐ 其他				

联系内容：

现做如下变更：

根据海绵城市要求，现做以下修改：

1.建筑屋面雨水管布置在下沉式绿地区域内部分立管做断接，底部设散水石，防冲刷。





以 下 空 白


设　计	校　对	项目(专业)负责人	审　核	审　定

本次共（1）页　第（1）页


注：该联系单一式五份　　建设方，施工方各二份，设计存一份

金华四中教育集团高铁新城校区基坑设计变更单

1、本工程基坑围护桩施工过程中，场地西侧（1-1 剖面）遇到三根老工程桩，老桩的位置对本基坑围护桩施工造成影响，为保证基坑围护的安全性及施工可行性，现对该部位采取如下变更，见下图。

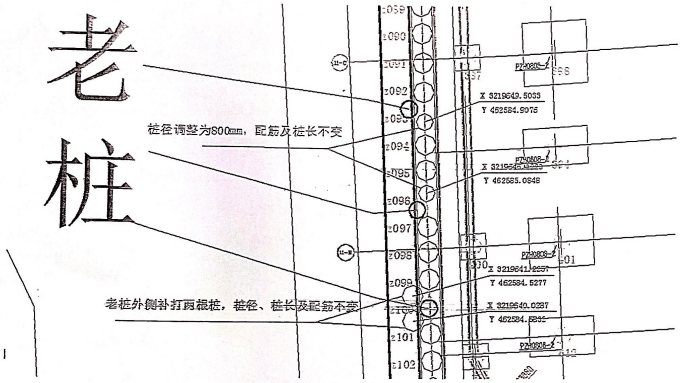

2、场地西侧（1-1 剖面）坡顶距离红线（围墙）距离较近，原设计方案的坡顶排水沟位置施工空间有限，现将坡顶排水沟位置变更至围护桩外侧，见下图。

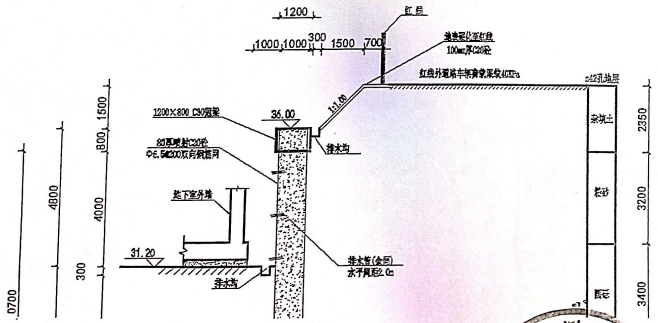

核工业金华勘测设计院有限公司

2022 年 9 月 2 日

设计单位
Design Institute

金华市城市规划设计院有限公司
JINHUA CITY
PLANNIGN & DESIGN Institute CO.,Ltd

设计修改联系单

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目	项目编号	2022-001
工程名称	小学部、初中部	联系单编号	JZ-01
设计阶段	施工图	专　业	建筑
主　送	金华市第四中学	抄　送	相关单位

更改原因　☐ 外部审查要求　☐建设单位要求　☐ 监理建议　☐ 施工建议　☐设计原因

1.初中部小学部教学楼仅靠近走廊一侧的平开窗改为推拉窗(窗户大小及位置均不变，仅开启方式改动)

盖章栏：

2023.04

设　计		工程负责人		审　核	

设计单位
Design Institute

金华市城市规划设计院有限公司
JINHUA CITY
PLANNIGN & DESIGN Institute CO.,Ltd

设计修改联系单

金华四中教育集团高铁新城校区

项目名称	项目	项目编号	2022-001
工程名称		联系单编号	JZ-01
设计阶段	施工图	专　业	建筑
主　送	金华市城市规划设计院有限公司	抄　送	相关部门

更改原因　□ 外部审查要求　√建设单位要求　□ 监理建议　□ 施工建议　□ 设计原因

根据建设单位要求，本工程内楼梯栏杆样式做变更，具体如下

1.初中部、小学部室内楼梯栏杆样式，由原15J403-1 (14/15) 改为 (16D808) 样式，
面管扶手采用硬木扶手，栏杆斜段扶手高度、水平扶手高度应按下方横杆的上顶面起算。
未详部分按原设计要求。

2.地下室D-1、D-2楼梯两侧栏杆样式，由原15J403-1 (14/15) 改为 (16D808) 样式，
面管扶手采用硬木扶手，栏杆斜段扶手高度、水平扶手高度应按下方横杆的上顶面起算。
中间栏杆改为15J403-1 (Z3/09) 栏杆高度为900。未详部分按原设计要求。

3.小学部室外楼梯两侧栏杆样式做变更，原15J403-1 (16/09) 改为 (16D808) 样式，
栏杆斜段扶手高度、水平扶手高度应按下方横杆的上顶面起算1200高，中间栏杆改为15J403-1 (Z3/09)，栏杆高度为900。未详部分按原设计要求。

以下空白

盖章栏：

设　计　谭丽亚　工程负责人　　审　核　　2023.10

设计单位
Design Institute

金华市城市规划设计院有限公司
JINHUA CITY
PLANNIGN & DESIGN Institute CO.,Ltd

设计修改联系单

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目	项目编号	2022-001
工程名称	小学部	联系单编号	SS-01
设计阶段	施工图	专　业	给排水
主 送	金华市第四中学	抄　送	相关单位


更改原因　□ 外部审查要求　☑建设单位要求　□ 监理建议　□ 施工建议　□设计原因

根据甲方要求，现做以下修改：

1. 三层8-1轴至8-7轴书法教室改计算机教室，取消原有给水、排水设施。

2. 二层9-1轴至9-5轴阅览室改美术教室（初中），
增设DN20给水、DN75排水设施。

2. 二层9-5轴9-XL-2消火栓位置，移至于美术教室（初中）走道隔墙上，面朝走道。

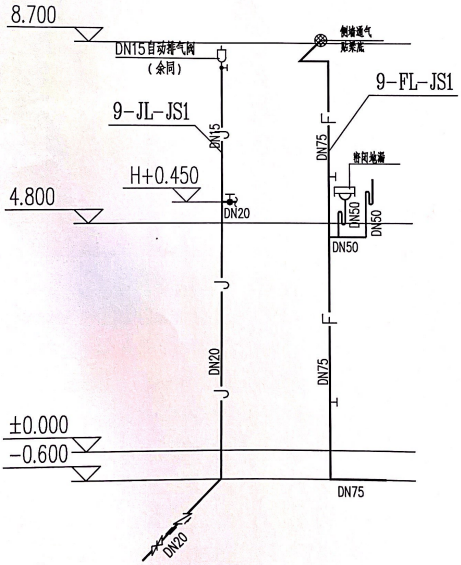

美术教室给排水系统图　1:100

盖章栏：

浙江省金华市城市规划设计院有限公司 建筑工程设计专用章 3307021003417

2023.08 日期

设　计		工程负责人		审　核	

金华市城市规划设计院有限公司
JINHUA CITY
PLANNIGN & DESIGN Institute CO.,Ltd

设计修改联系单

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目	项目编号	2022-001
工程名称	小学部	联系单编号	DQ-01
设计阶段	施工图	专　业	电气
主　送	金华市第四中学	抄　送	各相关单位

更改原因　☐ 外部审查要求　☐建设单位要求　☐ 监理建议　☐ 施工建议　☐设计原因

根据甲方意见做如下修改：

1、根据甲方意见建筑平面教室功能做调换，教室内电气、智能化的内容不做修改，电气根据教室的交换修改楼层配电总箱，详见附图。

2、根据甲方意见阅览教室装修平面修改，电气根据装修平面做如下修改，详见附图。


3、根据甲方意见美术教室和书法教室装修平面修改，电气根据装修平面做如下修改，详见附图。

以下空白

盖章栏：

2023-08

设　计		工程负责人		审　核	

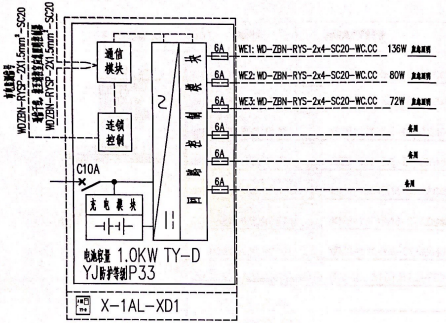

一层配变配电总箱/柜旗	支路号	保护开关	导线规格及穿管管径	相位	容量	负荷名称
X-1AP-zm1 Pe=113.0KW Kx=0.8 Cosφ=0.8 Pjs=90.4KW Ijs=171.7A 配变配电房专用总电 WDZB-RYS-2*1.5 穿线管保护 SC40 G2 多功能电表 CM1-250M/3P200A 带漏电保护 AH-0.66:3(200/5) WDZB-YJY-4x120+1x70 CT 引自室外变配电房 N PE	WP1	CH2L-63C/4P 25A	WDZB-YJY-5x6-CT/JDG40 SC40 G2	L123	6.0KW	收款配电箱 AK-xyl
	WP2	CM1-160M/3P 80A	WDZB-YJY-4x25+1x16-CT SC40 G3	L123	30.0KW	厂房配电箱 AK-gb
	WP3	CH2L-63C/4P 50A	WDZB-YJY-5x16-CT/JDG40 SC40 G2	L123	15.0KW	锅炉配电箱 AK-gl
	WP4	CH2L-63C/4P 40A	WDZB-YJY-5x10-CT/JDG40 SC40 G2	L123	12.0KW	热泵配电箱 WC-3AL-bq1
	WP5	CM1-160M/3P 80A	WDZB-YJY-4x25+1x16-CT SC40 G3	L123	25.0KW	风泵配电箱 AK-yls
	WP6	CM1-160M/3P 80A	WDZB-YJY-4x25+1x16-CT SC40 G3	L123	25.0KW	AK-STEAM
		CH2-63C/1P 16A		L1		备用
		CH2L-63C/2P 16A ~30mA		L2		备用
		CH2L-63C/2P 16A ~30mA		L3		备用
		CH2L-63C/4P 50A ~30mA YCB7NB/C63/P D-300 Ir=0.8In Im=10In SPD0806 RT3S-Rmid SPD806 RT3S-Rmid		L123		备用

二层配变配电总箱/柜旗	支路号	保护开关	导线规格及穿管管径	相位	容量	负荷名称
X-2AP-zm1 Pe=106.0KW Kx=0.8 Cosφ=0.8 Pjs=84.8KW Ijs=162A 配变配电房专用总电 WDZB-RYS-2*1.5 穿线管保护 SC40 G2 多功能电表 CM1-250M/3P200A 带漏电保护 AH-0.66:3(200/5) WDZB-YJY-4x120+1x70 CT 引自室外变配电房 N PE	WP1	CH2L-63C/4P 40A ~30mA YCB7NB/C63/P	WDZB-YJY-5x10-CT/JDG40 SC40 G2	L123	12.0KW	学前配变配电箱 AK-stfp
	WP2	CH2L-63C/4P 63A ~30mA YCB7NB/C63/P	WDZB-YJY-5x10-CT/JDG40 SC40 G2	L123	12.0KW	食品配变配电箱 AK-msjp
	WP3	CH2L-63C/4P 63A ~30mA YCB7NB/C63/P	WDZB-YJY-5x16-CT/JDG40 SC40 G2	L123	20.0KW	电子商务配变配电箱 AL-dzyl
	WP4	CM1-160M/3P 80A	WDZB-YJY-4x25+1x16-CT SC40 G3	L123	25.0KW	学生食堂配变配电箱 AK-jsl
	WP5	CM1-160M/3P 80A	WDZB-YJY-4x25+1x16-CT SC40 G3	L123	25.0KW	学生食堂配变配电箱 AK-jsl
	WP6	CH2L-63C/4P 32A ~30mA YCB7NB/C63/P	WDZB-YJY-5x6-CT/JDG40 SC40 G2	L123	9.0KW	学前配变配电箱 AK-yyjs
	WX1	CH2L-63C/2P 16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	学前插座
	WX2	CH2L-63C/2P 16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	学前插座
		CH2-63C/1P 16A		L3		备用
		CH2L-63C/2P 16A ~30mA		L1		备用
		CH2L-63C/2P 16A ~30mA		L2		备用
		CH2L-63C/4P 50A ~30mA YCB7NB/C63/P D-300 Ir=0.8In Im=10In SPD0806 RT3S-Rmid SPD806 RT3S-Rmid		L123		备用

TJ24 规范电箱 原则全配电箱变
引自室外办公变压器箱旁
用于配变进一组专用箱

学前配变配电箱/柜旗/室门箱	支路号	保护开关	导线规格及穿管管径	相位	容量	负荷名称
AK+stfp Pe=12.0KW Kx=1.0 Cosφ=0.90 Pjs=12.0KW Ijs=22.8A CH2L-63C/4P 32A (TJ24规范电箱原则全配电) ~30mA YCB7NB/C63/P WDZB-YJY-5x10-CT/JDG40 引自室内变配电房 N PE	WL1	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	照明
	WL2	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	照明
	WL3	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L3	1.0KW	照明
	WL4	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	照明
	WX1	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	学前插座
	WX2	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L3	1.0KW	学前插座
		CH2-63C/1P 16A		L1		备用
		CH2L-63C/2P16A ~30mA		L2		备用
		CH2L-63C/2P16A ~30mA		L3		备用

TJ24 规范电箱 原则全配电箱变
引自室外办公变压器箱旁
用于配变进一组专用箱

食堂配变配电箱/柜旗/室门箱	支路号	保护开关	导线规格及穿管管径	相位	容量	负荷名称
AK+msjp Pe=12.0KW Kx=1.0 Cosφ=0.90 Pjs=12.0KW Ijs=22.8A CH2L-63C/4P 32A (TJ24规范电箱原则全配电) ~30mA YCB7NB/C63/P WDZB-YJY-5x10-CT/JDG40 引自室内变配电房 N PE	WL1	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	照明
	WL2	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	照明
	WL3	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L3	1.0KW	照明
	WL4	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	照明
	WX1	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	学前插座
	WX2	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L3	1.0KW	学前插座
		CH2-63C/1P 16A		L1		备用
		CH2L-63C/2P16A ~30mA		L2		备用
		CH2L-63C/2P16A ~30mA		L3		备用

创成设计 图纸专用章

华建集团 上海市规划设计研究院有限公司
建筑工程技术专用章
91310101333473T

2023-08

三层配变配电总箱/明装

X-3AP-zm1
Pe=96.0KW
Kx=0.7
Cosφ=0.8
Pjs=67.2KW
Ijs=127.7A

WDZB-RYS-2*1.5阻燃双绞线

WDZB-RYS

多功能电表

CM1-315M/3P160A

带漏电功能
AH-0.66:3(150/5)

WDZB-YJY-4x70+1x35-CT

N PE

支路号	保护开关	导线规格及穿管管径	相位	容量	负荷名称
WP1	CH2L-63C/4P 40A	WDZB-YJY-5x10-CT/JDG40 (WDZB-RYS)	L123	12.0KW	办公室配电箱 AL-hys1
WP2	CH2L-63C/4P 40A	WDZB-YJY-5x10-CT/JDG40 (WDZB-RYS)	L123	12.0KW	办公室配电箱 AL-bg3
WP3	CH2L-63C/4P 32A	WDZB-YJY-5x6-CT/JDG40 (WDZB-RYS)	L123	9.0KW	办公室配电箱 AL-bg4
WP4	CH2L-63C/4P 32A	WDZB-YJY-5x6-CT/JDG40 (WDZB-RYS)	L123	9.0KW	专用配变配电箱 AK-zyjs
WP5	CH2L-63C/4P 63A	WDZB-YJY-5x16-CT/JDG40 (WDZB-RYS)	L123	21.0KW	计算机配变配电箱 AK-jsj
WP6	CH2L-63C/4P 63A	WDZB-YJY-5x16-CT/JDG40 (WDZB-RYS)	L123	21.0KW	计算机配变配电箱 AK-jsj
WP7	CH2L-63C/4P 32A	WDZB-YJY-5x6-CT/JDG40 (WDZB-RYS)	L123	9.0KW	备专用配变配电箱 AK-zyjs
WX1	CH2L-63C/2P 16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC/L1	L1	1.0KW	备用插座
	CH2-63C/1P 16A		L2		备用
	CH2L-63C/2P 16A ~30mA		L3		备用
	CH2L-63C/2P 16A ~30mA		L1		备用
	CH2L-63C/2P 16A ~30mA		L2		备用
	CH2L-63C/4P 50A ~30mA		L123		备用

网配室配电箱/暗装

AK-ys

Pe=25.0KW
Kx=1.0
Cosφ=0.80
Ps=25.0KW
Is=47.5A

CH2L-63C/4P 63A


WDZB-YJY-4x25+1x16-CT

引自楼层配电箱


N PE

支路号	保护开关	导线规格及穿管管径	相位	容量	负荷名称
WL1	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	照明
WL2	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	照明
WL3	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L3	1.0KW	照明
WL4	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	照明
WL5	CH2-63C/1P 16A	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	照明
WX1	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L3	1.0KW	备用插座
WX2	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	备用插座
WX3	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.0KW	备用插座
WX4	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L3	1.0KW	备用插座
WX5	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L1	1.0KW	备用插座
WX6	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x2.5+BYJR2.5-PC20-CC	L2	1.5KW	空调插座
	CH2L-63C/2P16A ~30mA		L3		备用
WX7	CH2L-63C/2P20A ~30mA	WDZB-BYJ-2x4+BYJR4-PC25-CC	L1	2.5KW	备用插座
WX8	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x4+BYJR4-PC25-CC	L2	1.0KW	备用插座
WX9	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x4+BYJR4-PC25-CC	L3	1.5KW	空调插座
WX10	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x4+BYJR4-PC25-CC	L1	1.5KW	空调插座
WX11	CH2L-63C/2P16A ~30mA	WDZB-BYJ-2x4+BYJR4-PC25-CC	L2	1.5KW	空调插座
	CH2-63C/1P 16A		L3		备用
	CH2L-63C/2P16A ~30mA		L1		备用
	CH2L-63C/2P16A ~30mA		L2		备用
	CH2-63C/3P20A ~30mA		L123		备用

盖章处
建筑工程技术专用章

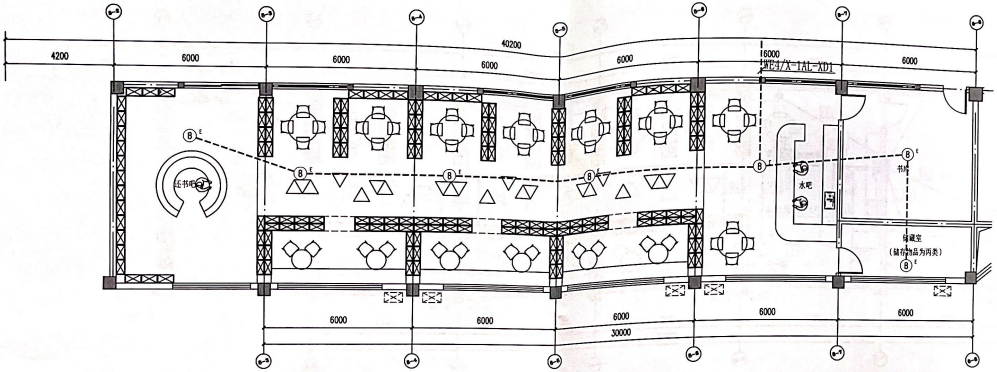


阅览室应急照明平面图 1:100

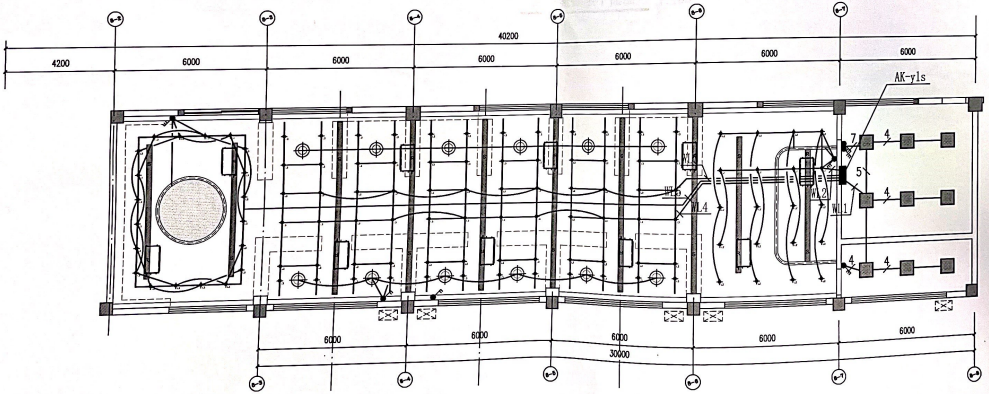

阅览室照明平面图 1:100

城市规划设计有限公司
建筑工程技术专用章
2023-08

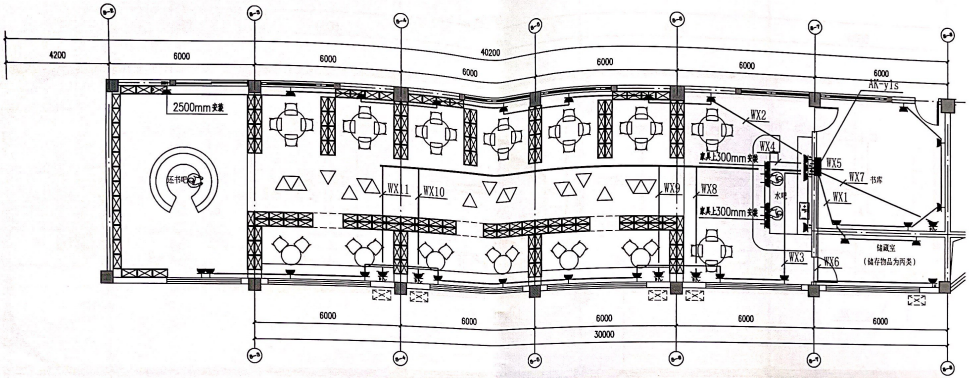


阅览室插座平面图 1:100


市城市规划设计研究院有限公司
建筑工程技术专用章
91370212033473

2023-08

设计 工程负责人 审核

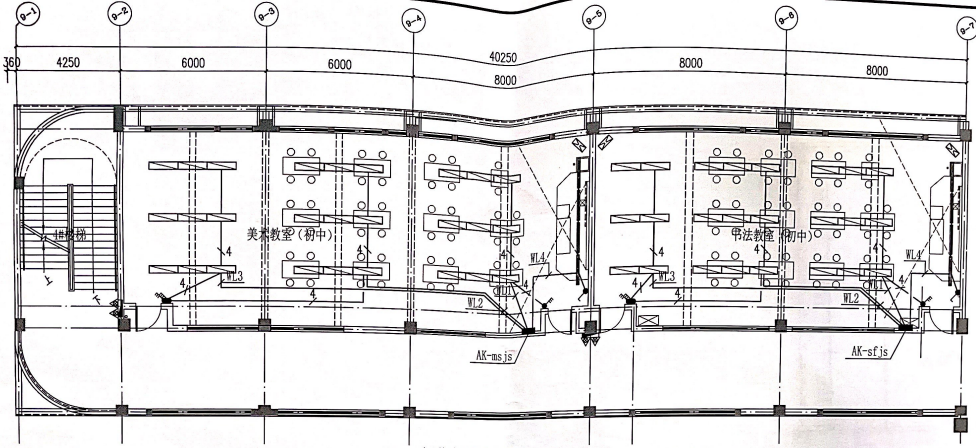

阅览室照明平面图 1:100

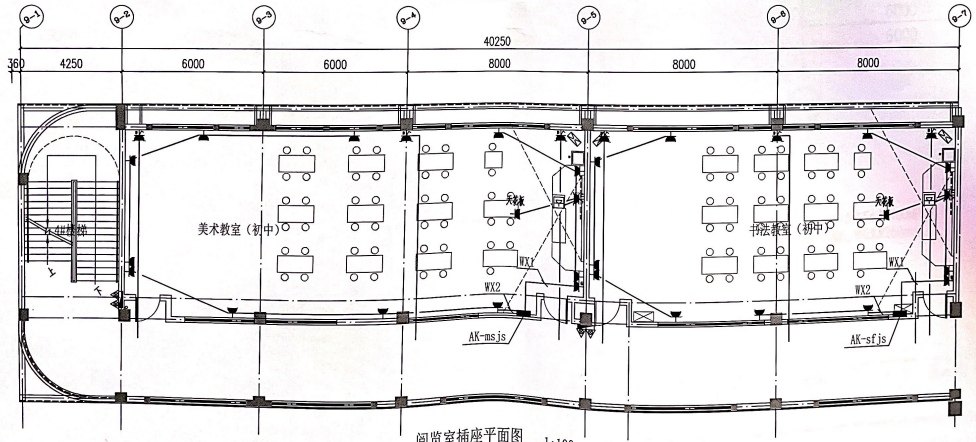

阅览室插座平面图 1:100

全省首个城市规划设计项目
建筑工程施工许可证
2023-08

设计单位
Design Institute

金华市城市规划设计院有限公司
JINHUA CITY
PLANNIGN & DESIGN Institute CO.,Ltd

设计修改联系单

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目	项目编号	
工程名称	小学部	联系单编号	JG-07
设计阶段	施工图	专　业	结构
主　送	金华市第四中学	抄　送	相关单位

更改原因　☐ 外部审查要求　☐建设单位要求　☐ 监理建议　☐ 施工建议　☐设计原因

根据建筑变更，现做以下修改：


1. 二层平面梁图9－5轴交9－B轴至9－C轴梁需加固，详附图01
2. 一层梁平面图中8－7轴，8－8轴梁板配筋不足加固，详附图02
3. 加固节点做法详附图03，附图04


盖章栏：


金华市城市规划设计院有限公司 建筑工程技术专用章 3307021003473

日期　2023.08

设　计		工程负责人		审　核	

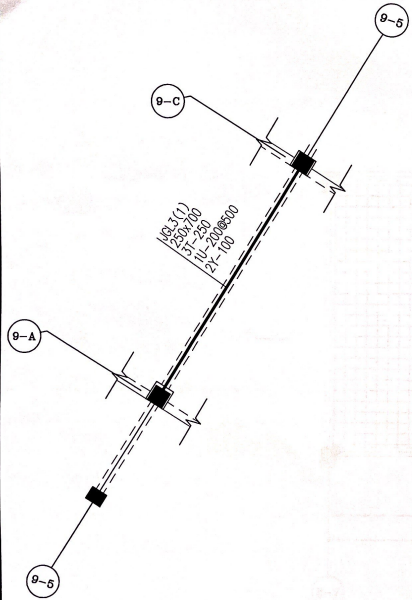

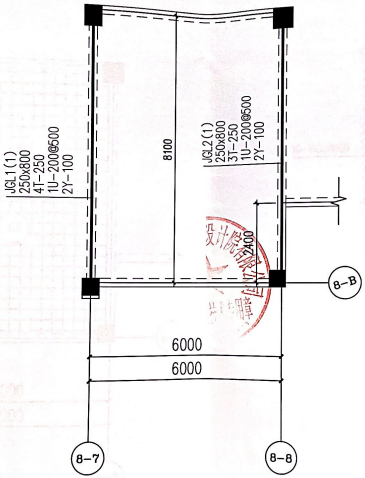

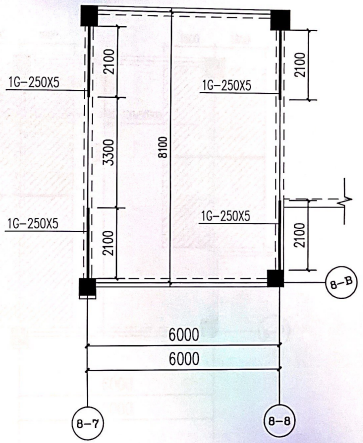

梁加固说明：


1. JGL1~JGL3表示置换碳纤维加固梁。
2. 碳纤维型号为300g，采用一级碳纤维布。弹性模量不小于200GPa，极限强度不小于3400MPa。
3. 框架线部分表示梁上表面粘钢加固梁负弯矩，1G-250x5表示粘贴一层钢板，钢板宽度250mm，厚度5mm。


盖章栏：

台州市城市规划设计院有限公司
建筑工程技术专用章
3307021005***

日期 2023.08

附图	01	设计	[illegible]	工程负责人	[illegible]	审核	[illegible]

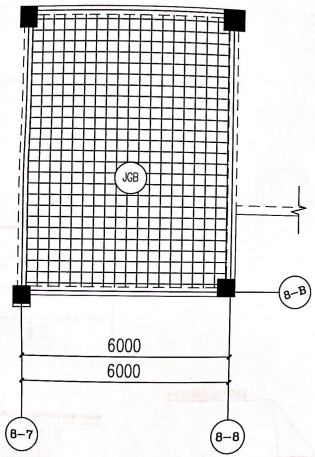

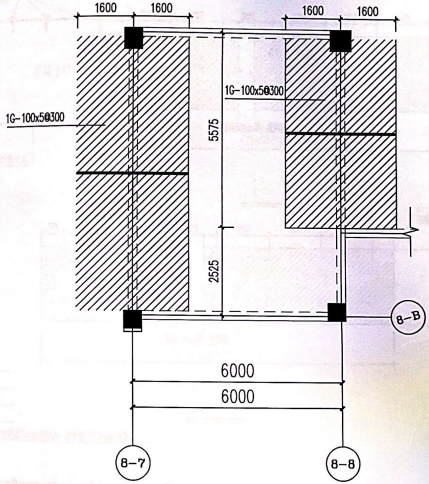

板加固说明：


1. JGB为板底粘贴碳纤维布，按1T-100@200，宽100间距200，单层双向布置。
2. 碳纤维型号为300g，采用一级碳纤维布。焊接强度不小于200GPa，极限强度不小于3400MPa。
3. 阴影部分表示板顶面粘钢板加固板面负弯矩，1G-100x5@300表示粘贴一层钢板，钢板宽度100mm厚度5mm，按间距300mm布置。

盖章栏：

合肥市城市规划设计院有限公司 建筑工程技术专用章


附图	02	设计	张乐俊	工程负责人	何小松	审核	蒋志武

日期 2023.08

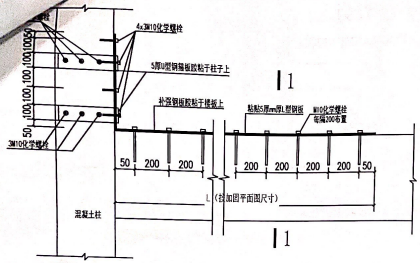


梁负弯矩加固大样图(有柱情况)


注：粘钢前均应凿除结构构件表面粉刷和杂质，清理干净，露出新鲜结构面，再涂刷A级改性环氧树脂结构胶。




梁负弯矩加固大样图(无柱情况)

注：粘钢前均应凿除结构构件表面粉刷和杂质，清理干净，露出新鲜结构面，再涂刷A级改性环氧树脂结构胶。







板面粘钢板加固详图

盖章栏：

金华市城市规划设计院
建筑工程品质

附图	03	设 计	张俊	工程负责人		审 核		日期	2023.08

设计单位
Design Institute

金华市城市规划设计院有限公司
JINHUA CITY
PLANNIGN & DESIGN Institute CO.,Ltd

设计修改联系单

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目	项目编号	2022-001
工程名称	小学部	联系单编号	JZ-04
设计阶段	施工图	专　业	建筑
主　送	金华市第四中学	抄　送	相关单位

更改原因　☐ 外部审查要求　☐建设单位要求　☐ 监理建议　☐ 施工建议　☐设计原因

根据学校使用功能要求，修改如下：


1、一层平面中计算机教室改阅览室，详见附图01；二层平面中阅览室改书法教室、美术教室，详见附图02；三层平面中书法教室改计算机教室.具体详见附图03.

以下空白

盖章栏：

设　计		工程负责人		审　核	

2023.09

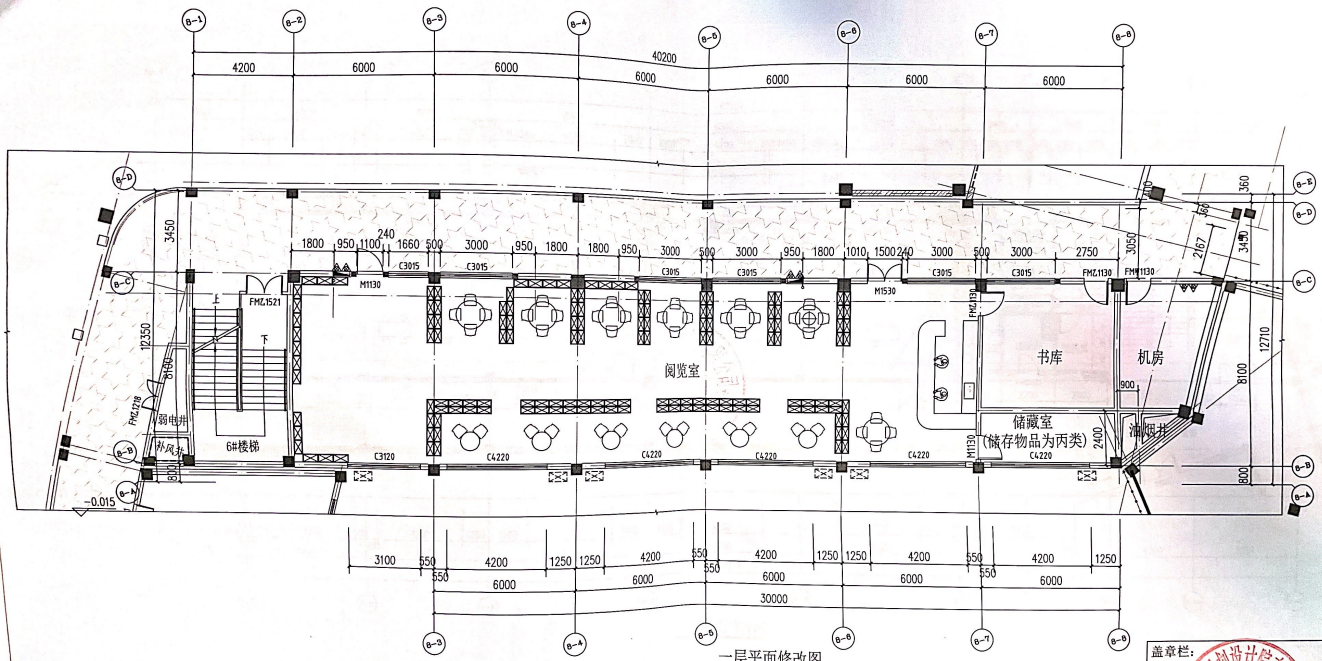


一层平面修改图

盖章栏：

日期 2023.08

附图	01	设 计		工程负责人		审 核	

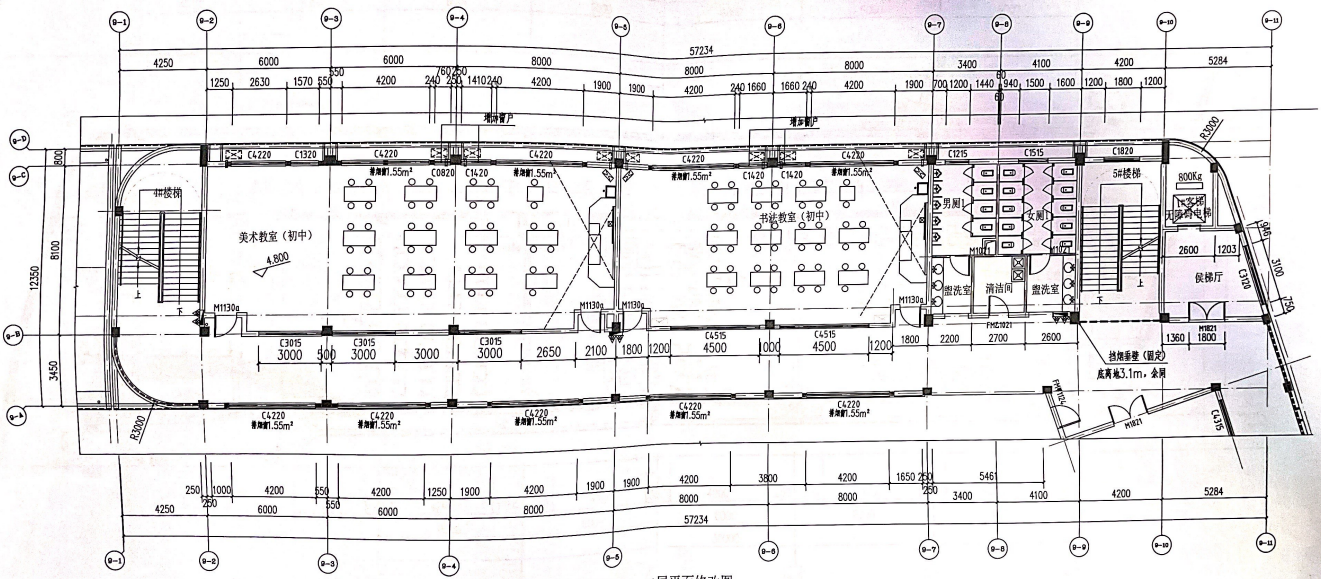


二层平面修改图

盖章栏：

兰州市城市规划设计研究院有限公司
建筑工程设计专用章

附图	02	设计		工程负责人		审核		日期	2023.08

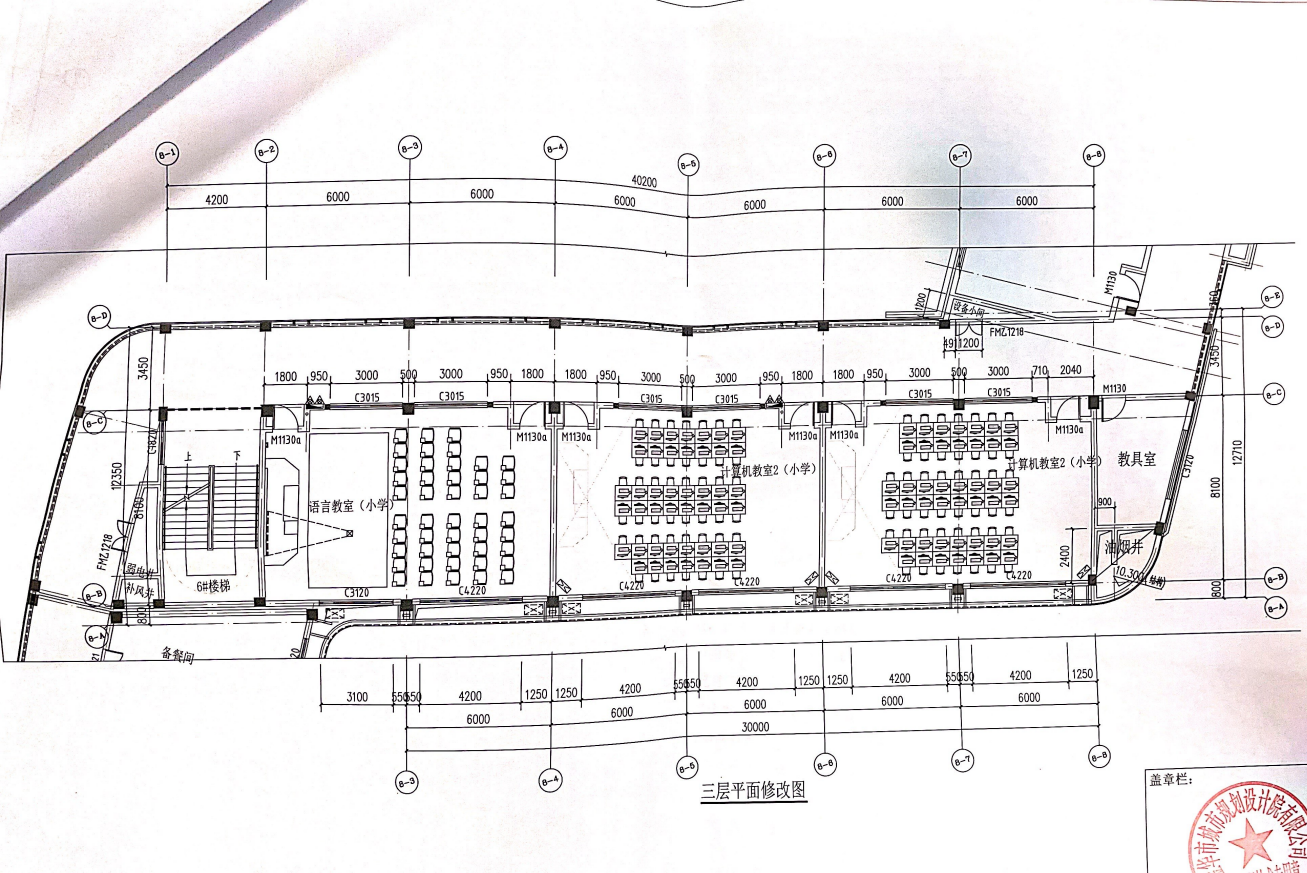

三层平面修改图

盖章栏：

日期 2023.08

附图	03	设计		工程负责人		审核	

金华市城市规划设计院有限公司

设计联系单

第 JT-06号

项目名称	金华四中教育集团高铁新城校区项目 小学部	工程号	2022-001	专　业	建筑
建设单位	金华市第四中学	签　收		日　期	2024.06
设计更改原因	☑甲方变更 ☐设计变更 ☐施工图审查修改 ☐施工反馈修改 ☐其他				

联系内容：

1. 根据学校使用要求，小学部室外楼梯改为铝板装饰，具体做法由厂家深化并设计认可。

以 下 空 白

设　计	校　对	项目(专业)负责人	审　核	审　定

本次共（1）页　第（1）页

注：该联系单一式五份　　建设方，施工方各二份，设计存一份
